

OBJET DU DOCUMENT | Installations Classées pour la Protection de l'Environnement, rapport d'auto-surveillance environnemental mensuel

CONTEXTE | Respect des prescriptions de l'arrêté d'autorisation n°1532 du 21 février 2005



Validation du document (Nom – visa – date)		
Rédacteur	Vérificateur	Approbateur
Responsable Exploitation	Responsable QHSE	Chef de Centrale

DIRECTION DE L'INDUSTRIE,
DES MINES ET DE L'ÉNERGIE
DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE

Arrivé le - 3 JAN. 2022

Enregistré le : 4 JAN. 2022

N° : 2022 - DIMENC - 366

Le 16-12-21


SOMMAIRE

1.	Synthèse de fonctionnement de la centrale	4
1.1	Fonctionnement de la tranche 1	4
1.2	Fonctionnement de la tranche 2	6
1.9	Synthèse de fonctionnement et de consommation de la centrale	9
2.	Rejets aqueux	10
2.1	PPIE	10
2.1.1	Analyses en continu	10
2.1.2	PPIE : Analyses hebdomadaires et mensuelles	14
2.1.3	PPIE : Ecart et plan d'actions	15
2.2	PPSW	16
2.2.1	PPSW : Analyses en continu	16
2.2.2	Analyses hebdomadaires et mensuelles	19
2.2.3	Ecart et plan d'actions	20
2.2.4	CTB : Analyses en continu	20
2.2.5	CTB : Analyses hebdomadaires et mensuelles	21
2.2.6	CTB : Ecart et plan d'actions	22
2.3	CSSW	23
2.3.1	Analyses en continu	23
2.3.2	Analyse mensuelle	26
2.3.3	Ecart et plan d'actions	26
3.	Les rejets gazeux	27
3.1	Débits totaux	27
3.2	Mesures en continu sur la tranche n°1	28
3.3	Mesures en continu sur la tranche n°2	29
3.4	Mesures des flux massiques totaux (pour les 2 tranches)	29
3.5	Analyse annuelle des rejets gazeux des cheminées	30
3.6	Rejets gazeux : écart et plan d'actions	32
3.6.1	Plan d'action : analyseurs de gaz	32
3.6.2	Plan d'action pour les rejets de poussière	33
4.	Emissions sonores	35
4.1	Contexte réglementaire	35
4.2	Procédure de mesures pour la campagne 2019	35
4.3	Résultats de la campagne de mesures 2019	37
5.	Les déchets	38
5.1	Suivi mensuel de déchets	38
5.2	Déchets : Ecart et plan d'actions	39
6.	Surveillance des légionnelles	40

6.1	Résultats des analyses mensuelles	40
6.2	Légionnelles : écarts et plan d'actions	41
Annexe - 1.	Rapport Bureau Veritas – Mesures des émissions atmosphériques –Août 2021	44

1. Synthèse de fonctionnement de la centrale


1.1 Fonctionnement de la tranche 1

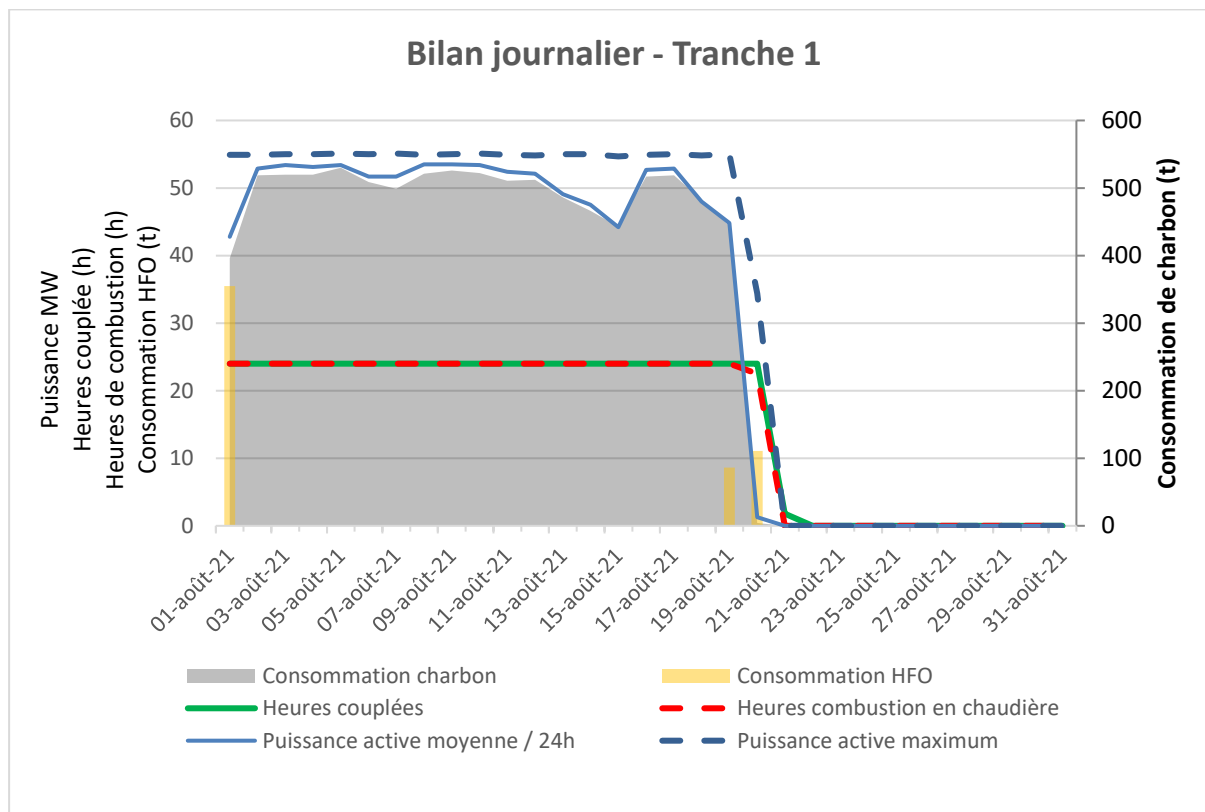

Août 2021	Évènements Tranche 1
	01 août 2021 11h55 : broyeur 2 établi
	20 août 2021 01h51 Découplage et arrêt de la tranche pour révision

Août 2021 Tranche 1	Heures couplées	Heures combustion en chaudière	Puissance active moyenne / 24h	Puissance active maximum	Consommation HFO	Consommation charbon
	h	h	MW	MW	t	t
01 août 2021	24,0	24,0	42,8	54,9	35,5	396
02 août 2021	24,0	24,0	52,9	54,9	0,0	519
03 août 2021	24,0	24,0	53,4	55,0	0,0	520
04 août 2021	24,0	24,0	53,1	55,0	0,0	520
05 août 2021	24,0	24,0	53,4	55,1	0,0	530
06 août 2021	24,0	24,0	51,7	55,0	0,0	509
07 août 2021	24,0	24,0	51,7	55,1	0,0	499
08 août 2021	24,0	24,0	53,5	54,9	0,0	521
09 août 2021	24,0	24,0	53,5	55,0	0,0	526
10 août 2021	24,0	24,0	53,4	55,1	0,0	522
11 août 2021	24,0	24,0	52,4	54,9	0,0	511
12 août 2021	24,0	24,0	52,1	54,8	0,0	512
13 août 2021	24,0	24,0	49,1	55,0	0,0	486
14 août 2021	24,0	24,0	47,5	55,0	0,0	466
15 août 2021	24,0	24,0	44,2	54,7	0,0	443
16 août 2021	24,0	24,0	52,7	54,9	0,0	517
17 août 2021	24,0	24,0	52,9	55,0	0,0	519
18 août 2021	24,0	24,0	48,0	54,8	0,0	483
19 août 2021	24,0	24,0	44,8	55,0	8,6	444
20 août 2021	1,8	22,5	1,3	34,4	11,1	4
21 août 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
22 août 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
23 août 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
24 août 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
25 août 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
26 août 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
27 août 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
28 août 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
29 août 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
30 août 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
31 août 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0

1.2 Fonctionnement de la tranche 2

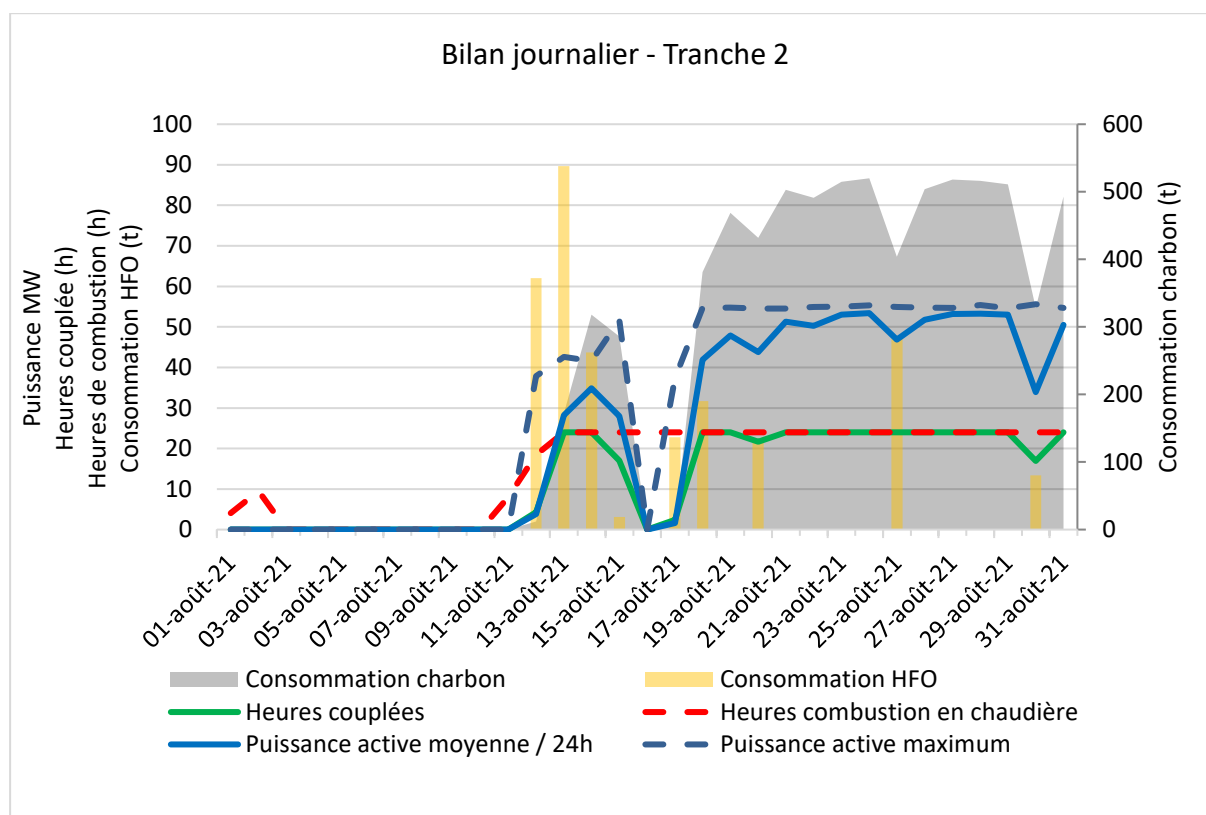

Août 2021	Evènements Tranche 2
01 août 2021	Fin de la révision de la tranche. 20h29 : Allumage brûleur diesel 23h00 : Purge à chaud de la chaudière
02 août 2021	03h27 : Allumage brûleur diesel 05h20 : Purge à chaud de la chaudière
03 août 2021	Tranche à l'arrêt pour travaux complémentaires.
11 août 2021	16h25 : Allumage diesel 19h00 : Allumage brûleur HFO
12 août 2021	0h20 : Arrêt brûleur des brûleurs pour maintenance. 05h49 : Allumage diesel 09h02 : Trip brûleur diesel 09h05 : Allumage diesel 14h58 : Trip chaudière 15h29 : Allumage brûleur diesel 18h42 : Couplage 18h45 : Arrêt normal turbine sur tests de sécurité 19h00 : Allumage brûleurs HFO 19h48 : Couplage 20h29 : Broyeur 1 établi 20h55 : Trip Broyeur 1 sur perte flamme

	21h41 : Broyeur 1 établi 22h55 : Trip Broyeur 1 sur perte flamme
13 août 2021	10h35 : Broyeur 1 établi 15h58 : Broyeur 2 établi 22h50 : Trip du Broyeur 2 sur bourrage
14 août 2021	02h02 : Broyeur 2 établi 07h23 : arrêt du broyeur 1 pour travaux 10h44 : Broyeur 1 établi 11h13 : Arrêt du Broyeur 1 pour travaux 16h48 : Broyeur 1 établi
15 août 2021	16h30 : Arrêt broyeur 1 16h44 : Arrêt broyeur 2 17h00 : Découplage turbine Unité à l'arrêt pour travaux
17 août 2021	11h00 : Allumage bruleur diesel 17h24 : Allumage brûleur HFO 21h34 : Couplage turbine 22h00 : broyeur 2 établi 23h27 : broyeur 1 établi
18 août 2021	00h02 : Arrêt broyeur 2 pour travaux 11h21 Broyeur 2 établi 12h16 Tous brûleurs HFO à l'arrêt 100% charbon
20 août 2021	12h39 Trip turbine + trip broyeur 2 13h54 Trip broyeur 1 14h56 : couplage 15h43 Broyeur 1 établi 18h20 Broyeur 2 établi
25 août 2021	02H54 : Broyeur 1 à l'arrêt pour travaux 14H00 : Broyeur 1 établie
30 août 2021	13h21 : Trip Turbine 16h10 : Allumage brûleur diesel 17h55 : Allumage brûleurs HFO 20h27 : Couplage turbine 21h22 : Broyeur 1 établi 22h14 : Broyeur 2 établi

Août 2021 Tranche 2	Heures couplées	Heures combustion en chaudière	Puissance active moyenne / 24h	Puissance active maximum	Consommation HFO	Consommation charbon
	h	h	MW	MW	t	t
01 août 2021	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0
02 août 2021	0,0	9,5	0,0	0,0	0,0	0
03 août 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
04 août 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
05 août 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
06 août 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
07 août 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
08 août 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
09 août 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
10 août 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
11 août 2021	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0
12 août 2021	4,3	18,4	3,8	37,9	62,0	12
13 août 2021	24,0	24,0	28,2	42,6	89,7	172
14 août 2021	24,0	24,0	34,9	41,6	43,7	318
15 août 2021	17,0	24,0	28,0	51,7	3,1	286
16 août 2021	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0
17 août 2021	2,4	24,0	1,6	37,4	22,8	7
18 août 2021	24,0	24,0	41,9	54,7	31,7	381
19 août 2021	24,0	24,0	47,9	54,8	0,0	469
20 août 2021	21,7	24,0	43,8	54,5	22,5	432
21 août 2021	24,0	24,0	51,3	54,5	0,0	503
22 août 2021	24,0	24,0	50,3	54,9	0,0	491
23 août 2021	24,0	24,0	53,0	55,0	0,0	515
24 août 2021	24,0	24,0	53,4	55,3	0,0	520
25 août 2021	24,0	24,0	46,9	54,9	47,8	404
26 août 2021	24,0	24,0	51,8	54,8	0,0	504
27 août 2021	24,0	24,0	53,2	54,7	0,0	518
28 août 2021	24,0	24,0	53,3	55,4	0,0	516
29 août 2021	24,0	24,0	53,0	54,6	0,0	511
30 août 2021	16,9	24,0	33,9	55,6	13,4	328
31 août 2021	24,0	24,0	50,5	54,7	0,0	493

1.3 Synthèse de fonctionnement et de consommation de la centrale

	Synthèse fonctionnement		
	Tranche 1	Tranche 2	Total
Heures couplées	481,8	398,3	880,10
Heures combustion en chaudière	478,5	474,4	952,90
Puissance active moyenne (MW)	50,7*	40,9*	45,8
Puissance active maximum (MW)	55,1	55,6	55,6
Consommation HFO (tonnes)	55,2	336,7	391,9
Consommation charbon (tonnes)	9447	7380	16 827,00

* Période hors arrêt.

2. Rejets aqueux

2.1 PPIE


2.1.1 Analyses en continu

Les données temps réel sont fournies par la supervision des stations d'eaux et sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.


A noter que la CDE continue en parallèle d'effectuer des analyses journalières relatives à ces paramètres.


	Disponibilité des mesures	Durée de fonctionnement	Moyenne journalière Débit sortie	% mesure débit <55 m3/h	Moyenne journalière Turbidité	Moyenne journalière pH	% mesure sur 24h 6.5<pH<8.5	Moyenne journalière Température	% mesure sur 24h <35 °C	Moyenne journalière conductivité
	%	%	m3/h	%	NTU	pH	%	°C	%	µS/cm
01/08/2021	100%	38%	24,1	74%	14,9	7,0	100%	30,4	0%	117,2
02/08/2021	98%	42%	24,6	73%	17,0	7,2	100%	32,8	0%	135,0
03/08/2021	99%	34%	19,4	78%	12,8	7,0	100%	30,0	0%	90,3
04/08/2021	99%	34%	19,2	79%	16,1	7,1	100%	28,8	0%	132,3
05/08/2021	98%	29%	16,4	82%	13,5	7,0	100%	28,8	0%	78,5
06/08/2021	99%	33%	18,5	80%	13,7	7,1	100%	28,0	0%	119,8
07/08/2021	99%	27%	16,9	82%	12,9	7,1	100%	27,0	0%	71,1
08/08/2021	100%	26%	17,8	83%	11,7	7,1	100%	27,4	0%	82,4
09/08/2021	98%	25%	17,0	83%	14,6	7,2	100%	26,9	0%	77,3
10/08/2021	99%	27%	18,3	83%	13,7	7,0	100%	26,4	0%	59,5
11/08/2021	100%	28%	19,8	81%	12,4	7,0	100%	26,1	0%	63,1
12/08/2021	99%	41%	28,2	73%	16,7	7,0	100%	29,7	0%	104,3
13/08/2021	99%	45%	31,4	70%	23,5	7,2	100%	29,3	0%	83,5
14/08/2021	98%	41%	27,8	73%	17,1	7,2	100%	30,8	0%	78,3
15/08/2021	99%	40%	26,5	74%	16,3	7,0	100%	29,9	0%	215,1
16/08/2021	99%	33%	21,5	79%	15,4	7,1	100%	30,3	0%	97,9
17/08/2021	100%	32%	20,5	80%	13,7	7,1	100%	29,0	0%	85,9
18/08/2021	100%	44%	27,3	71%	15,5	7,2	100%	31,6	0%	104,8
19/08/2021	99%	45%	29,0	70%	16,1	7,2	100%	31,2	0%	115,2
20/08/2021	99%	35%	22,9	79%	15,3	7,2	100%	31,0	0%	98,8
21/08/2021	100%	29%	19,0	82%	12,7	6,7	66%	27,3	0%	103,6
22/08/2021	100%	30%	18,4	83%	14,0	6,8	94%	25,8	0%	69,6
23/08/2021	97%	29%	18,3	83%	16,5	7,3	100%	25,8	0%	85,2
24/08/2021	100%	22%	13,8	87%	12,5	7,7	100%	25,7	0%	68,2
25/08/2021	99%	24%	14,8	86%	10,6	7,9	100%	28,2	0%	55,8
26/08/2021	100%	23%	13,4	88%	11,3	7,6	100%	28,2	0%	57,8
27/08/2021	100%	38%	25,0	76%	13,2	7,3	100%	27,3	0%	63,4
28/08/2021	100%	35%	22,7	78%	14,5	7,3	100%	27,3	0%	54,9
29/08/2021	100%	23%	13,8	87%	12,1	7,3	100%	28,9	0%	42,2
30/08/2021	100%	23%	13,8	87%	11,9	7,2	100%	27,7	0%	44,1
31/08/2021	100%	27%	16,3	84%	13,5	7,3	100%	29,1	0%	55,4
Moyenne	99%	32%	20,5	80%	14,4	7,2	99%	28,6	0%	87,4



Mesure de débit (m³/h) en continu - Rejets effluents industriels (6-IP1)

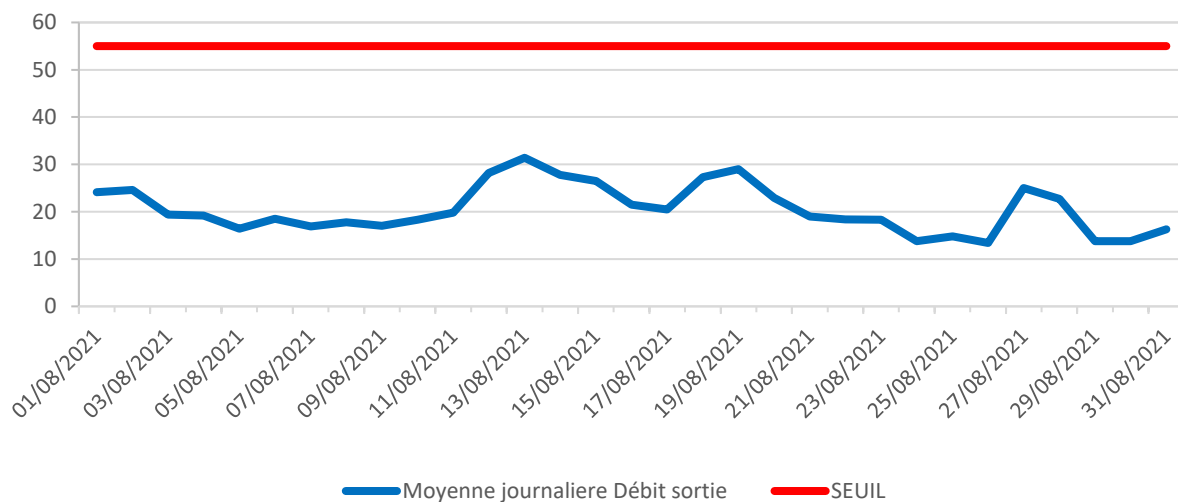

Mesure de turbidité (en NTU) en continu - Rejets effluents industriels (6-IP1)

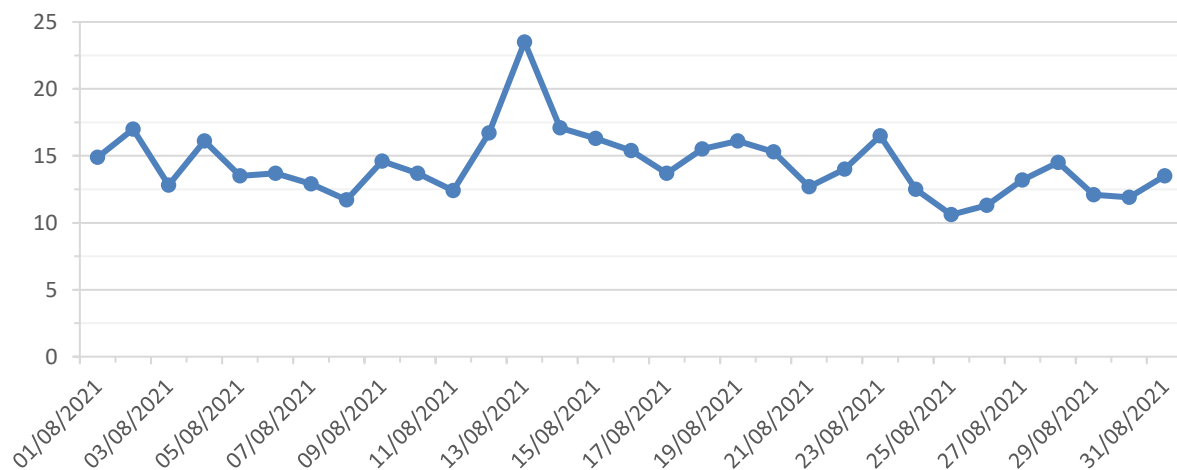

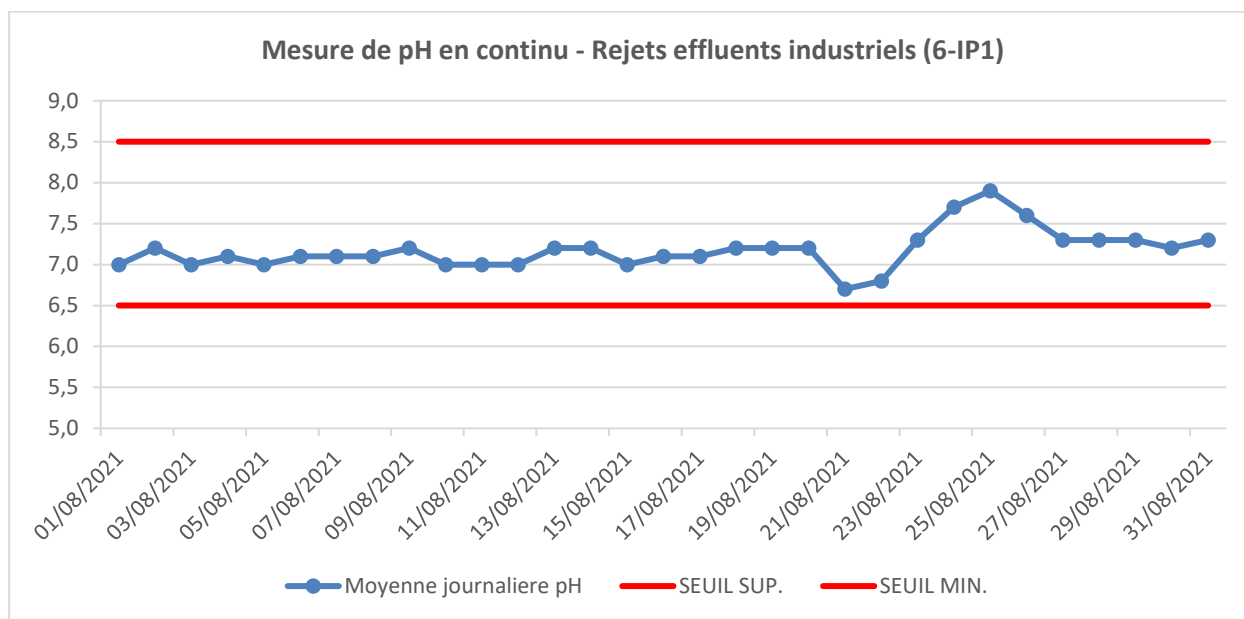

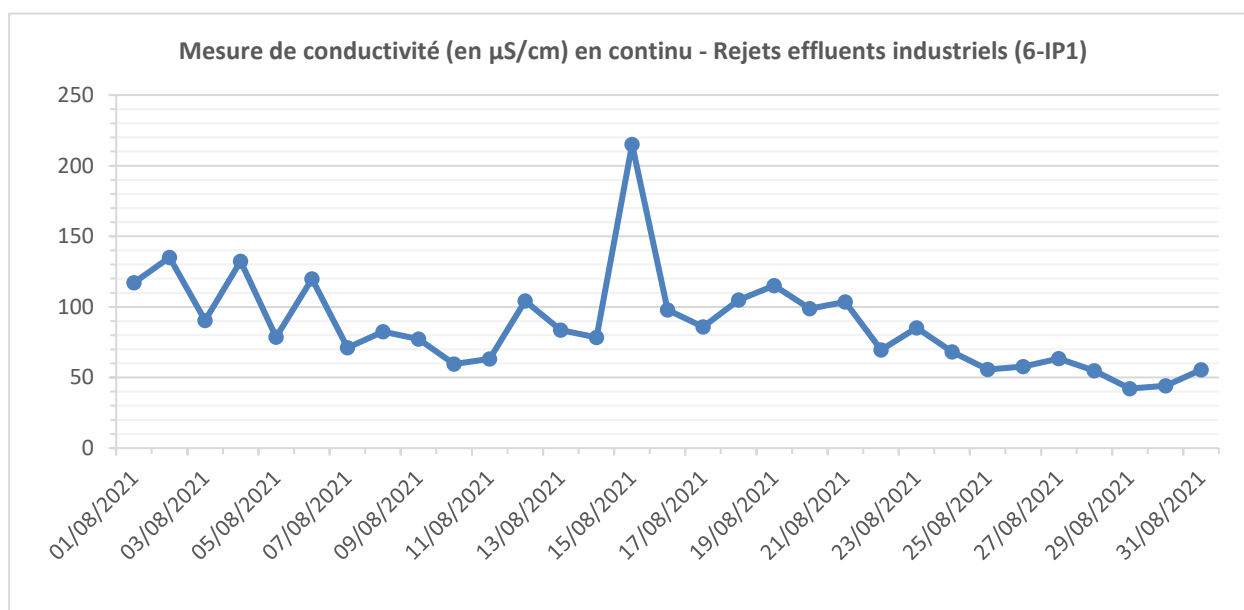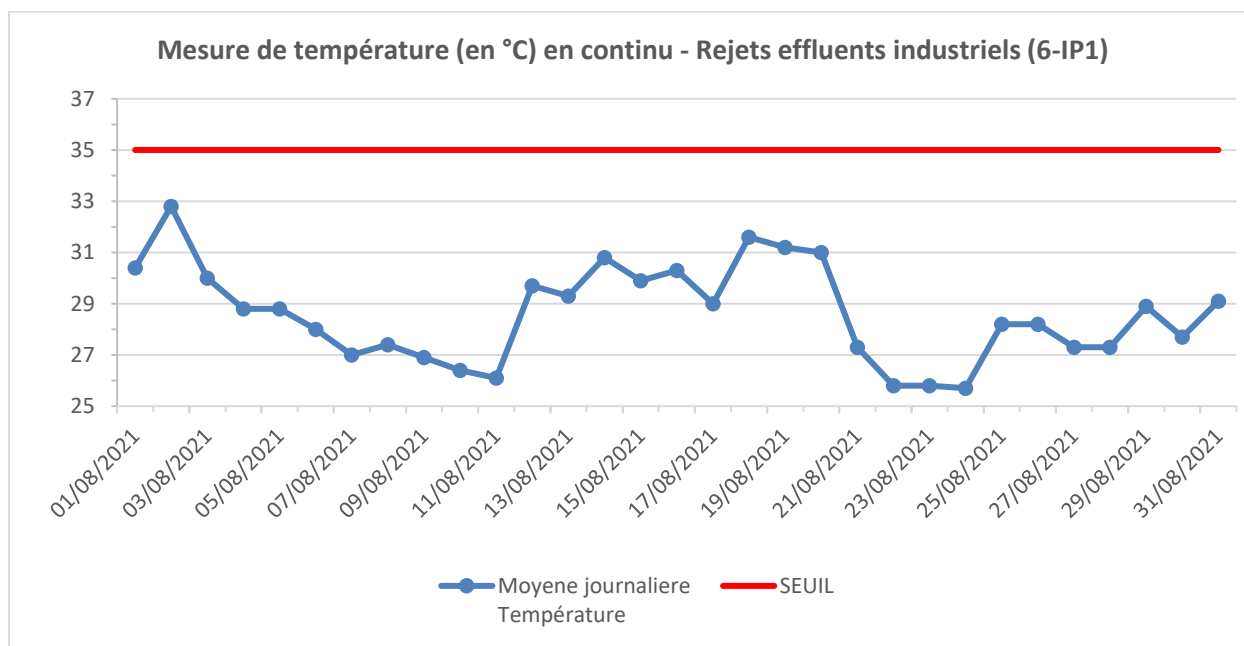

Analyse des résultats :

- **Débit** : RAS.
- **Turbidité** : RAS.
- **pH** : RAS.
- **Température** : RAS.
- **Conductivité** : RAS.

2.1.2 PPIE : Analyses hebdomadaires et mensuelles

	Unité	Seuil Règl,	Seuil Règl, En cond. excep. justifiée	Périodicité	Méthode de référence	10/08/2021	16/08/2021	23/08/2021	30/08/2021
Débit eau rejetée	m3/h			Continu					
Température	°C	< 35°C	-	Continu	-	25,1	28,2	23,6	27,1
pH	pH	6,5 < pH < 8,5	6,5 < pH < 8,5	Continu	-	7,14	6,94	7,24	7,32
Conductivité	µS/cm			Continu	-		513	292	563
Azote total	mg/l en N	< 20 mg/l	-	Hebdo	ISO29441	0,6	0,4	0,1	0,6
Demande biochimique en oxygène	mg/l en O2	< 30 mg/l	< 30 mg/l	Hebdo	MANOMETRIQ	1	5	1	1
Indice Phénol	mg/l en C6H5OH	< 0,3 mg/l	< 0,3 mg/l	Hebdo	NFISO14402	0,05	0,05	0,05	0,05
Matières en suspension	mg/l	< 30 mg/l	< 45 mg/l	Hebdo	NFEN872	15,48	15,7	2	19,6
Phosphore	mg/l en P	< 10 mg/l	< 10 mg/l	Hebdo	NFISO15681	1,5	1,5	0,4	1,8
ST-DCO	mg/l en O2	< 80 mg/l	< 125 mg/l	Hebdo	ISO 15705	12	13	3	17
Turbidité in situ	NFU	-	-	Continu	TURBIDIMET	15,7	20,8	23,67	13,7
Aluminium	mg/l en Al	< 5 mg/l	< 5 mg/l	Hebdo	NFEN172942				4,085
Composés organiques halogénés	mg/l en AOX	< 0,5 mg/l	< 0,5 mg/l	Mensuelle	NFISO 9562				0,11
Cadmium	mg/l en Cd	< 0,05 mg/l	< 0,05 mg/l	Mensuelle	NFEN172942				0,0001
Cyanures libres	mg/l en CN	< 0,1 mg/l	< 0,1 mg/l	Mensuelle	NFISO14403				0,005
Chrome VI	mg/l en Cr VI	< 0,1 mg/l	< 0,1 mg/l	Mensuelle	ISO 23913				0,0237
Cuivre	mg/l en Cu	< 0,5 mg/l	< 0,5 mg/l	Mensuelle	NFEN172942				0,003
Fluorures	mg/l en F	< 15 mg/l	< 15 mg/l	Mensuelle	NFIS103041				0,05
Fer	mg/l en Fe	< 5 mg/l	< 5 mg/l	Mensuelle	NFEN172942				0,467
Mercuré	mg/l en Hg	< 0,05 mg/l	< 0,05 mg/l	Mensuelle	NFEN172942				0,0002
Indice Hydrocarbures (C10-C40)	mg/l	< 10 mg/l	< 10 mg/l	Mensuelle	NFISO93772				0,1
Manganèse	mg/l en Mn	< 1 mg/l	< 1 mg/l	Mensuelle	NFEN172942				0,0127
Nickel	mg/l en Ni	< 0,5 mg/l	< 0,5 mg/l	Mensuelle	NFEN172942				0,037
Plomb	mg/l en Pb	< 0,1 mg/l	< 0,1 mg/l	Mensuelle	NFEN172942				0,0003
Etain	mg/l en Sn	< 2 mg/l	< 2 mg/l	Mensuelle	NFEN172942				0,0007
Zinc	mg/l en Zn	< 2 mg/l	< 2 mg/l	Mensuelle	NFEN172942				1,016

Commentaires : Tous les résultats sont conformes.

2.1.3 PPIE : Ecart et plan d'actions

Les effluents au point de rejet 6-IP1 correspondent aux effluents issus de la centrale et de ses process associés : eaux de purge acides ou basiques chargées ou non d'impuretés, eaux de lavage de certaines installations, eaux de pluie de certaines zones « sensibles ». Ces eaux sont collectées, traitées et analysées dans l'unité PPIE (*Power Plant Industrial Effluent*) avant leur évacuation sur PR NC.

Plan d'actions pour la PPIE					
Ecart	Description action	Observations	Avancement	Objectif	Echéance
Ph > 8,5 ou < 6,5 en sortie UCD	Mise en service de la fosse de neutralisation de l'unité de déminéralisation	Cette fosse de neutralisation n'a jamais été mise en service. Projet décalé en investissement en 2021.	0%	6,5 < pH < 8,5 en sortie UCD	Juin 2022
Conductivité et/ou turbidité élevée en sortie d'UCD	Mise en service d'une centrifugeuse au niveau des 2 bassins de décantation	Réception du matériel prévue pour décembre 2020. Mise en service à replanifier (retard suite COVID-19 et blocage du site)	50%	Absence de débordement d'eau cendrée dans les installations de PR et dans l'environnement	Déc.2021

2.2 PPSW

2.2.1 PPSW : Analyses en continu

Les données temps réel sont fournies par la supervision des stations d'eaux et sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

A noter que la CDE continue en parallèle d'effectuer des analyses journalières relatives à ces paramètres. Ces données, lorsqu'elles sont utilisées, sont notées en bleu dans le tableau ci-dessous.


	Disponibilité des mesures (Débit)	Durée de fonctionnement	Moyenne journalière Débit	% mesure débit <70 m3/h	Turbidité	pH	% mesure sur 24h 6.5<pH<8.5	Température relevée lors des rondes	% mesure sur 24h <35 °C	Conductivité relevée lors des rondes
	%	%	m3/h	%	NTU	pH	%	°C	%	µS/cm
01/08/2021	91%	16%	3,4	100%	1,6	7,1	-	22,2	-	373,0
02/08/2021	100%	0%	0,0	100%			-		-	
03/08/2021	100%	13%	2,6	100%	4,7	6,9	-	25,8	-	376,0
04/08/2021	100%	8%	0,0	100%			-		-	
05/08/2021	88%	12%	2,3	100%	5,0	7,1	-	22,3	-	224,0
06/08/2021	100%	0%	0,0	100%			-		-	
07/08/2021	100%	0%	0,0	100%			-		-	
08/08/2021	39%	20%	3,0	100%			-		-	
09/08/2021	44%	20%	4,8	100%	2,0	7,4	-	21,0	-	233,0
10/08/2021	100%	10%	1,8	100%	10,9	7,4	-	20,2	-	226,0
11/08/2021	100%	0%	0,0	100%			-		-	
12/08/2021	100%	0%	0,0	100%			-		-	
13/08/2021	100%	15%	3,0	100%	20,8	7,4	-	23,6	-	320,0
14/08/2021	100%	15%	3,2	100%	12,6	6,8	-	23,1	-	355,0
15/08/2021	100%	0%	0,0	100%			-		-	
16/08/2021	100%	12%	2,2	100%	3,2	6,9	-	22,3	-	344,0
17/08/2021	100%	11%	1,9	100%	3,3	6,8	-	24,6	-	334,0
18/08/2021	100%	12%	1,9	100%	5,4	6,9	-	24,3	-	326,0
19/08/2021	100%	0%	0,0	100%			-		-	
20/08/2021	100%	0%	0,0	100%			-		-	
21/08/2021	100%	10%	1,9	100%	6,0	7,4	-	21,8	-	504,0
22/08/2021	100%	0%	0,0	100%			-		-	
23/08/2021	100%	11%	1,6	100%	4,4	7,3	-	20,2	-	239,0
24/08/2021	100%	0%	0,0	100%			-		-	
25/08/2021	100%	13%	2,2	100%	17,0	7,6	-	21,9	-	233,0
26/08/2021	100%	6%	0,0	100%	5,6	7,3	-	21,3	-	254,0
27/08/2021	100%	13%	1,9	100%	6,1	7,3	-	26,6	-	791,0
28/08/2021	100%	0%	0,0	100%			-		-	
29/08/2021	100%	0%	0,0	100%			-		-	
30/08/2021	100%	10%	0,0	100%	2,8	6,7	-	22,5	-	324,0
31/08/2021	100%	0%	0,0	100%			-		-	
Moyenne	96%	7%	1,2	100%	7,0	7,1	-	22,7	-	341,0

A noter :


— : données indisponibles.

Case vide : pas de mise en service car niveau des bassins bas.


Mesure de débit (m³/h) en continu - Rejets effluents pluviaux (6-IP2)


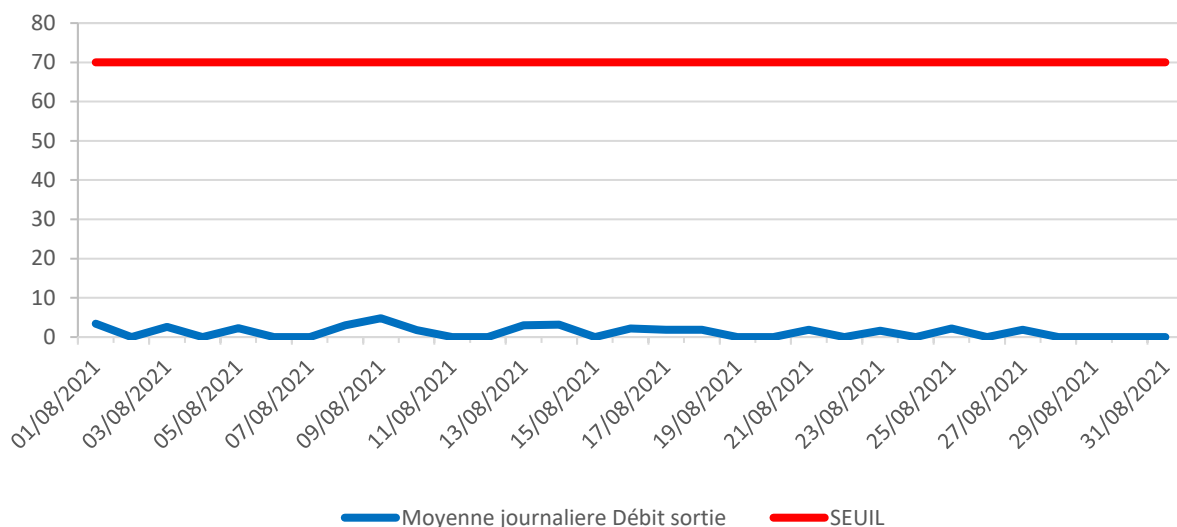


Mesure de turbidité (en NTU) - Rejets effluents pluviaux (6-IP2)

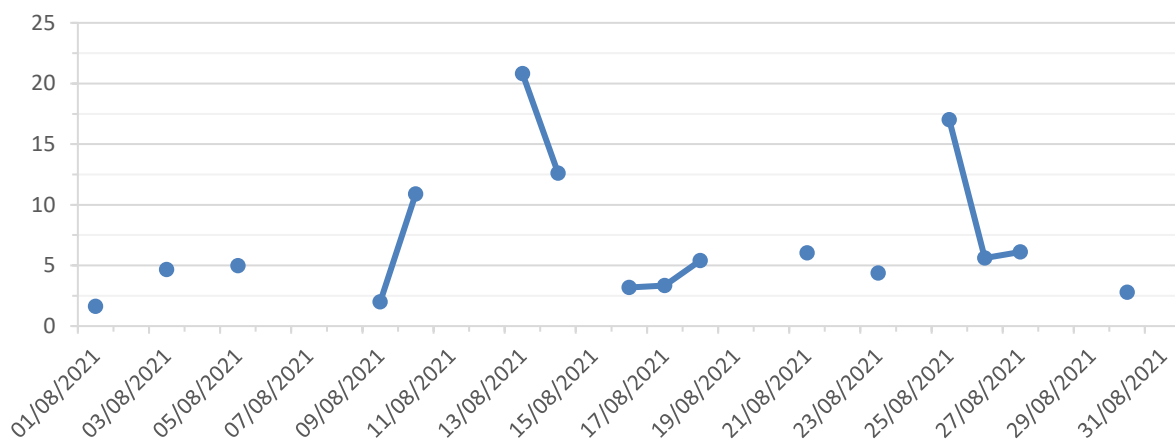

Mesure de pH en continu - Rejets effluents pluviaux (6-IP2)

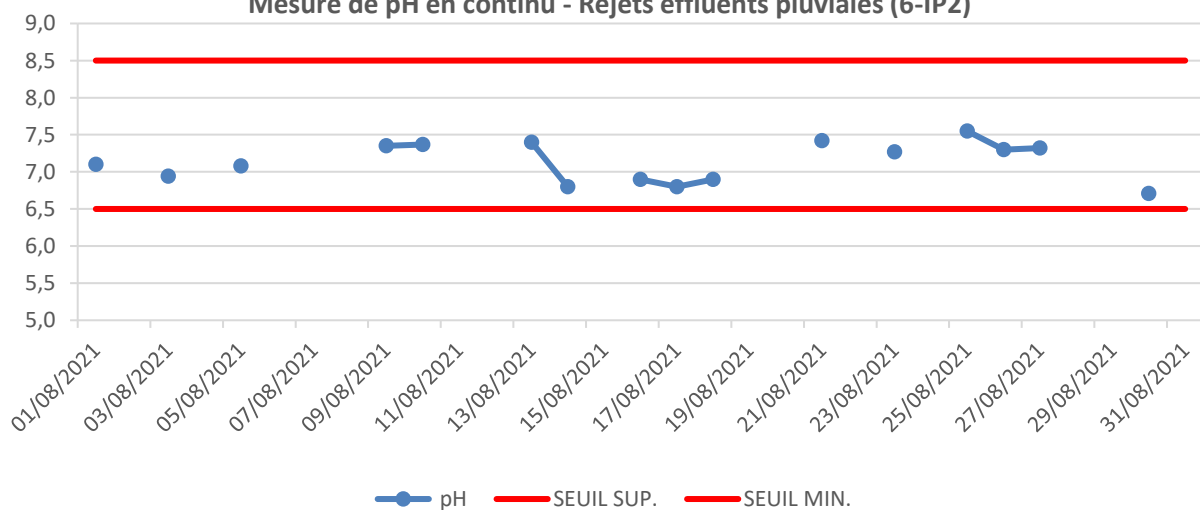

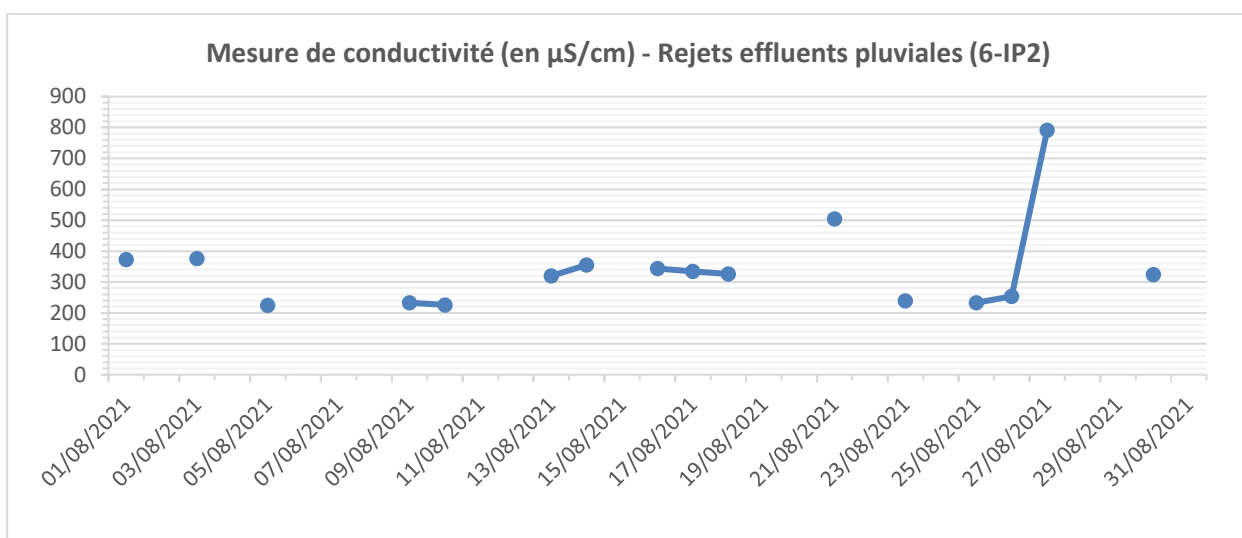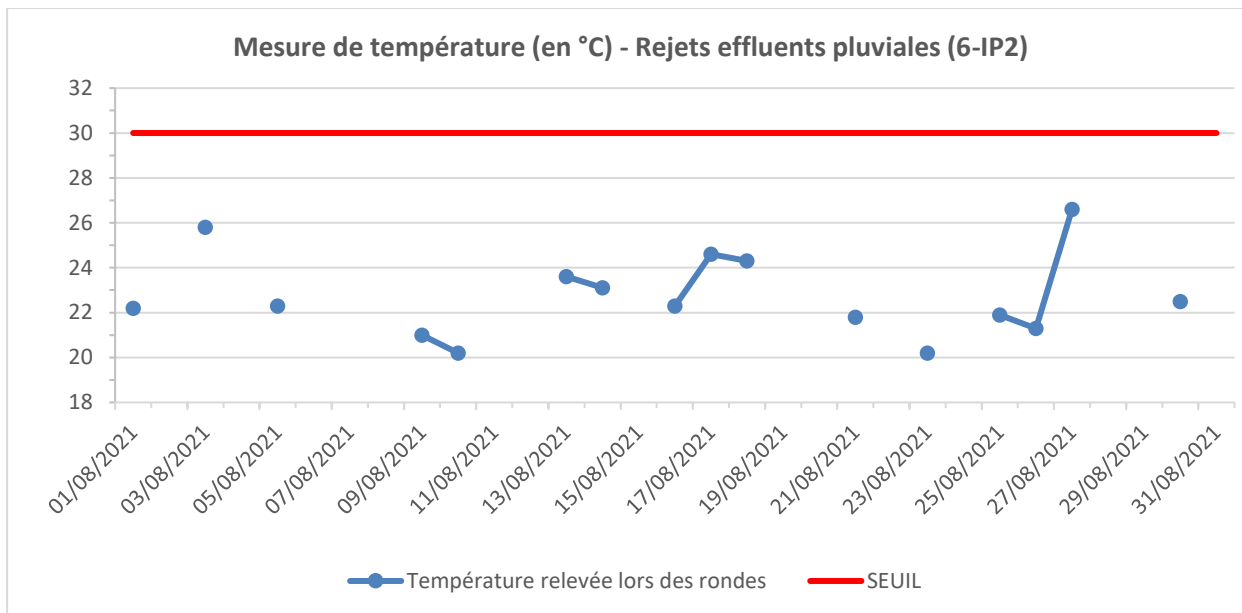

Analyse des résultats :

- Débit : RAS
- Turbidité : RAS
- pH : RAS
- Température : RAS.
- Conductivité : RAS

2.2.2 Analyses hebdomadaires et mensuelles

	Unité	Seuil Règl.	Seuil Règl. En cond excep. Justifiée	Périodicité	Méthode de référence	04/08/2021	10/08/2021	16/08/2021	23/08/2021	30/08/2021
Débit eau rejetée	m3/h	70m3/h	195m3/h	Continu						
Température	°C	< 35°C	< 35°C	Continu	-	23,2	22,2	22,8	20,2	22,5
pH	pH	6.5 < pH < 8.5	6.5 < pH < 8.5	Continu	-	7,04	7,56	7,05	7,27	6,71
Conductivité	µS/cm			Continu	-			342	239	324
Azote total	mg/l en N	< 20 mg/l	< 20 mg/l	Hebdo	ISO29441	0,2	0,1	0,2	0,2	0,5
Demande biochimique en oxygène	mg/l en O2	< 30 mg/l	< 30 mg/l	Hebdo	MANOMETRIQ	1	1	1	1	1
Indice Phénol	mg/l en C6H5OH	< 0.3 mg/l	< 0.3 mg/l	Hebdo	NFISO14402	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Matières en suspension	mg/l	< 35 mg/l	< 50 mg/l	Hebdo	NFEN872	2	2	2	2	2
Phosphore	mg/l en P	< 10 mg/l	< 10 mg/l	Hebdo	NFISO15681	0,2	0,3	0,2	1,1	0,4
ST-DCO	mg/l en O2	< 125 mg/l	< 125 mg/l	Hebdo	ISO 15705	3	3	3	4	6
Turbidité in situ	NFU	-	-	Continu	TURBIDIMET	2,86	3,59	2,86	4,37	2,8
Aluminium	mg/l en Al	< 5 mg/l	< 5 mg/l	Hebdo	NFEN172942					0,057
Composés organiques halogénés	mg/l en AOX	< 0.5 mg/l	< 0.5 mg/l	Mensuelle	NFISO 9562					0,012
Cadmium	mg/l en Cd	< 0.05 mg/l	< 0.05 mg/l	Mensuelle	NFEN172942					0,0001
Cyanures libres	mg/l en CN	< 0.1 mg/l	< 0.1 mg/l	Mensuelle	NFISO14403					0,005
Chrome VI	mg/l en Cr VI	< 0.1 mg/l	< 0.1 mg/l	Mensuelle	ISO 23913					0,011
Cuivre	mg/l en Cu	< 0.5 mg/l	< 0.5 mg/l	Mensuelle	NFEN172942					0,001
Fluorures	mg/l en F	< 15 mg/l	< 15 mg/l	Mensuelle	NFIS103041					0,05
Fer	mg/l en Fe	< 5 mg/l	< 5 mg/l	Mensuelle	NFEN172942					0,003
Mercuré	mg/l en Hg	< 0.05 mg/l	< 0.05 mg/l	Mensuelle	NFEN172942					0,0002
Indice Hydrocarbures (C10-C40)	mg/l	< 10 mg/l	< 10 mg/l	Mensuelle	NFISO93772					0,1
Manganèse	mg/l en Mn	< 1 mg/l	< 1 mg/l	Mensuelle	NFEN172942					0,0065
Nickel	mg/l en Ni	< 0.5 mg/l	< 0.5 mg/l	Mensuelle	NFEN172942					0,0049
Plomb	mg/l en Pb	< 0.1 mg/l	< 0.1 mg/l	Mensuelle	NFEN172942					0,0002
Etain	mg/l en Sn	< 2 mg/l	< 2 mg/l	Mensuelle	NFEN172942					0,0008
Zinc	mg/l en Zn	< 2 mg/l	< 2 mg/l	Mensuelle	NFEN172942					0,017
Commentaires : RAS										

2.2.3 *Ecart et plan d'actions*

Plan d'actions pour la PPSW					
Ecart	Description action	Observations	Avancement	Objectif	Echéance
Risque d'envoi d'effluents non conformes dans l'environnement ou les installations de PR NC	Construction d'un regard en amont du pit sud-est afin de pouvoir stopper toute pollution issue de la PPIE.	Etude en cours pour modifier le design du pit sud-est suivant les résultats de la mise en service de la centrifugeuse PPIE	30%	Pas d'effluents non conformes dans l'environnement ou les installations de PR NC	Pour l'étude : déc.2021

2.2.4 *CTB : Analyses en continu*

Les eaux de purge des tours aéroréfrigérantes ne sont plus dirigées vers le bassin d'analyses (CTB) localisé près de l'unité PPSW ni rejetées dans le milieu naturel au point 6-IP2. Ces eaux sont recyclées dans l'eau process de l'usine de Vale-NC depuis le 22/06/2012. Ainsi, toutes les périodes sans rejet vers le milieu naturel ne font pas l'objet de mesures. Des échantillons sont tout de même prélevés directement dans les circuits des tours aéroréfrigérantes.

2.2.5 CTB : Analyses hebdomadaires et mensuelles

	Unité	Seuil Règl,	Seuil Règl, En cond excep, Justifiée	Périodicité	Méthode de référence	04/08/2021	10/08/2021	16/08/2021	23/08/2021	30/08/2021
Débit eau rejetée	m3/h	70m3/h	195m3/h	Continu						
Température	°C	< 35°C	-	Continu	-	24,1	32,8	30,1	30,4	33,2
pH	pH	6,5 < pH < 8,5	6,5 < pH < 8,5	Continu	-	7,21	7,23	7,27	6,56	7,28
Conductivité	µS/cm			Continu	-			441	437	499
Azote total	mg/l en N	< 20 mg/l	< 20 mg/l	Hebdo	ISO29441	0,2	0,7	0,6	0,3	0,8
Demande biochimique en oxygène	mg/l en O2	< 30 mg/l	< 30 mg/l	Hebdo	MANOMETRIQ	1	1	1	1	1
Indice Phénol	mg/l en C6H5OH	< 0,3 mg/l	< 0,3 mg/l	Hebdo	NFISO14402	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Matières en suspension	mg/l	< 30 mg/l	< 50 mg/l	Hebdo	NFEN872	8	5,25	5,38	2,75	4,38
Phosphore	mg/l en P	< 10 mg/l	< 10 mg/l	Hebdo	NFISO15681	2,4	2,6	2,8	2,8	2,9
ST-DCO	mg/l en O2	< 125mg/l	< 125 mg/l	Hebdo	ISO 15705	18	20	19	21	26
Turbidité in situ	NFU	-	-	Continu	TURBIDIMET	18,1	13	17,9	17,1	16,1
Aluminium	mg/l en Al	< 5 mg/l	< 5 mg/l	Hebdo	NFEN172942					0,308
Composés organiques halogénés	mg/l en AOX	< 0,5 mg/l	< 0,5 mg/l	Mensuelle	NFISO 9562					0,28
Cadmium	mg/l en Cd	< 0,05 mg/l	< 0,05 mg/l	Mensuelle	NFEN172942					0,0001
Cyanures libres	mg/l en CN	< 0,1 mg/l	< 0,1 mg/l	Mensuelle	NFISO14403					0,005
Chrome VI	mg/l en Cr VI	< 0,1 mg/l	< 0,1 mg/l	Mensuelle	ISO 23913					0,0288
Cuivre	mg/l en Cu	< 0,5 mg/l	< 0,5 mg/l	Mensuelle	NFEN172942					0,004
Fluorures	mg/l en F	< 15 mg/l	< 15 mg/l	Mensuelle	NFIS103041					0,05
Fer	mg/l en Fe	< 5 mg/l	< 5 mg/l	Mensuelle	NFEN172942					0,61
Mercure	mg/l en Hg	< 0,05 mg/l	< 0,05 mg/l	Mensuelle	NFEN172942					0,0003
Indice Hydrocarbures (C10-C40)	mg/l	< 10 mg/l	< 10 mg/l	Mensuelle	NFISO93772					0,1
Manganèse	mg/l en Mn	< 1 mg/l	< 1 mg/l	Mensuelle	NFEN172942					0,019
Nickel	mg/l en Ni	< 0,5 mg/l	< 0,5 mg/l	Mensuelle	NFEN172942					0,0822
Plomb	mg/l en Pb	< 0,1 mg/l	< 0,1 mg/l	Mensuelle	NFEN172942					0,0002
Etain	mg/l en Sn	< 2 mg/l	< 2 mg/l	Mensuelle	NFEN172942					0,0006
Zinc	mg/l en Zn	< 2 mg/l	< 2 mg/l	Mensuelle	NFEN172942					1,868
Commentaire : RAS										

2.2.6 CTB : Ecart et plan d'actions

Plan d'actions CTB					
Ecart	Description action	Observations	Avancement	Objectif	Echéance
Pas de suivi en continu et en temps réel des caractéristiques des effluents en sortie du CTB	Création d'une nouvelle supervision en salle de contrôle. Modification du YOKOGAWA réalisée. Mise en œuvre 2021.	Il reste à installer les débitmètres et à raccorder l'ensemble des capteurs aux système de télégestion.	60%	100 % des mesures en ligne suivies en temps réel.	Déc 2021

2.3 CSSW

2.3.1 Analyses en continu




La CSSW traite les eaux de pluie s'écoulant sur la zone de stockage du charbon ainsi que les eaux de lavage de la chargeuse. Ces eaux sont collectées, traitées et analysées avant leur rejet dans le milieu naturel au point 6-IP3. Il n'y a pas de rejet en continu sur ce site. L'activation de l'unité de traitement dépend des phénomènes pluvieux et du niveau d'eau dans les bassins de traitement.



Pour ce mois, l'ensemble des mesures est issu des relevés journaliers effectués par la CDE.

	Disponibilité des mesures (Débit)	Durée de fonctionnement	Moyenne journalière Débit sortie	% mesure débit <70 m3/h	Turbidité	pH	% mesure sur 24h 6.5<pH<8.5	Température relevée lors des rondes	% mesure sur 24h <35 °C	Conductivité relevée lors des rondes
	%	%	m3/h	%	NTU	pH	%	°C	%	µS/cm
01/08/2021	0%	-		-			-		-	
02/08/2021	0%	-		-			-		-	
03/08/2021	0%	-		-			-		-	
04/08/2021	0%	-		-			-		-	
05/08/2021	0%	-		-			-		-	
06/08/2021	0%	-		-			-		-	
07/08/2021	0%	-		-			-		-	
08/08/2021	0%	-		-			-		-	
09/08/2021	0%	-		-			-		-	
10/08/2021	0%	-		-			-		-	
11/08/2021	0%	-		-			-		-	
12/08/2021	0%	-		-			-		-	
13/08/2021	0%	-		-			-		-	
14/08/2021	0%	-		-			-		-	
15/08/2021	0%	-		-			-		-	
16/08/2021	0%	-		-			-		-	
17/08/2021	0%	-		-			-		-	
18/08/2021	0%	-		-			-		-	
19/08/2021	0%	-		-			-		-	
20/08/2021	0%	-		-			-		-	
21/08/2021	0%	-		-			-		-	
22/08/2021	0%	-		-			-		-	
23/08/2021	0%	-		-			-		-	
24/08/2021	0%	-		-			-		-	
25/08/2021	0%	-		-			-		-	
26/08/2021	0%	-		-			-		-	
27/08/2021	0%	-		-			-		-	
28/08/2021	0%	-		-			-		-	
29/08/2021	0%	-		-			-		-	
30/08/2021	0%	-	11,5	-	6,2	7,0	-	24,1	-	1228,0
31/08/2021	0%	-	4,3	-	11,6	6,8	-	24,2	-	1074,0
Moyenne	0%	-	7,9	-	8,9	6,9	-	24,2	-	1151,0

— : données indisponibles

Case vide : pas de mise en service, niveau des bassins de décantation bas.

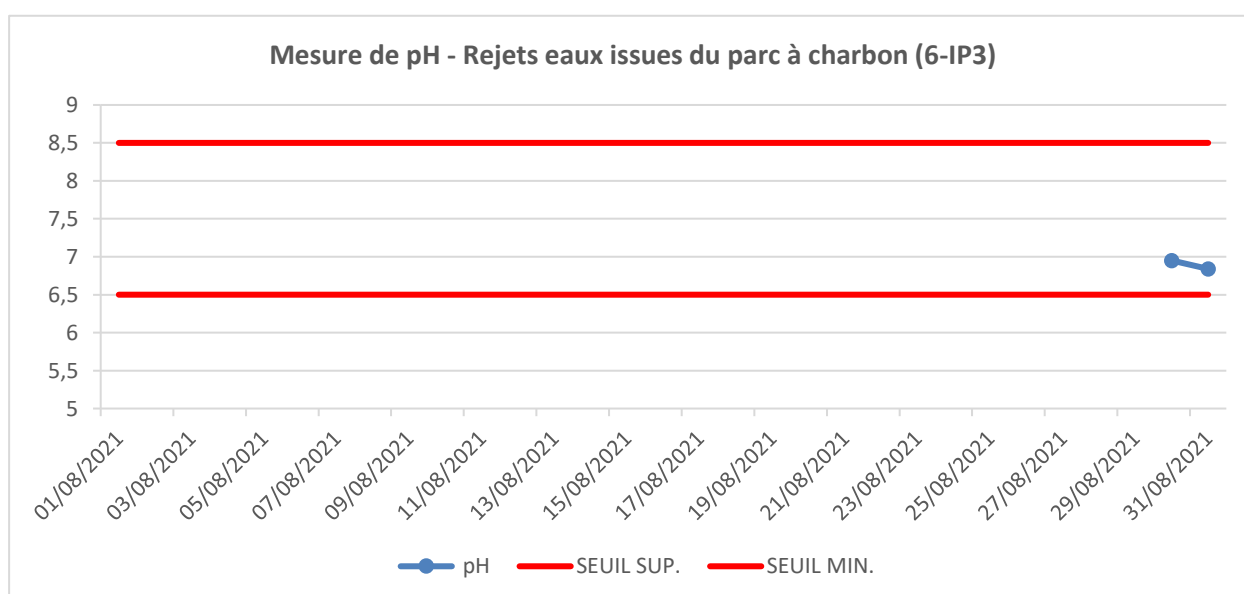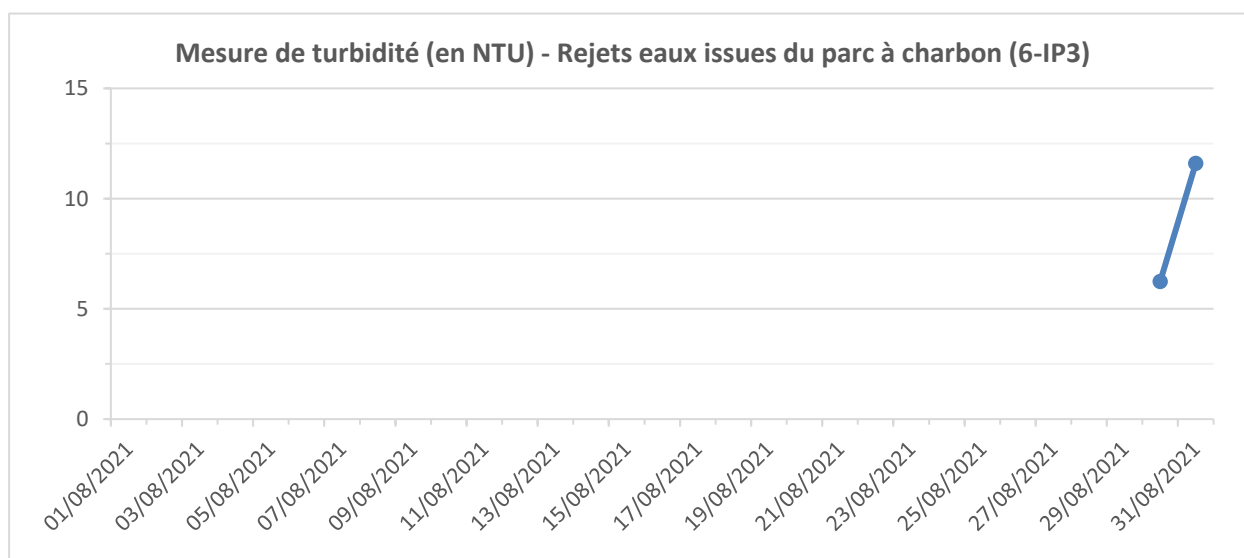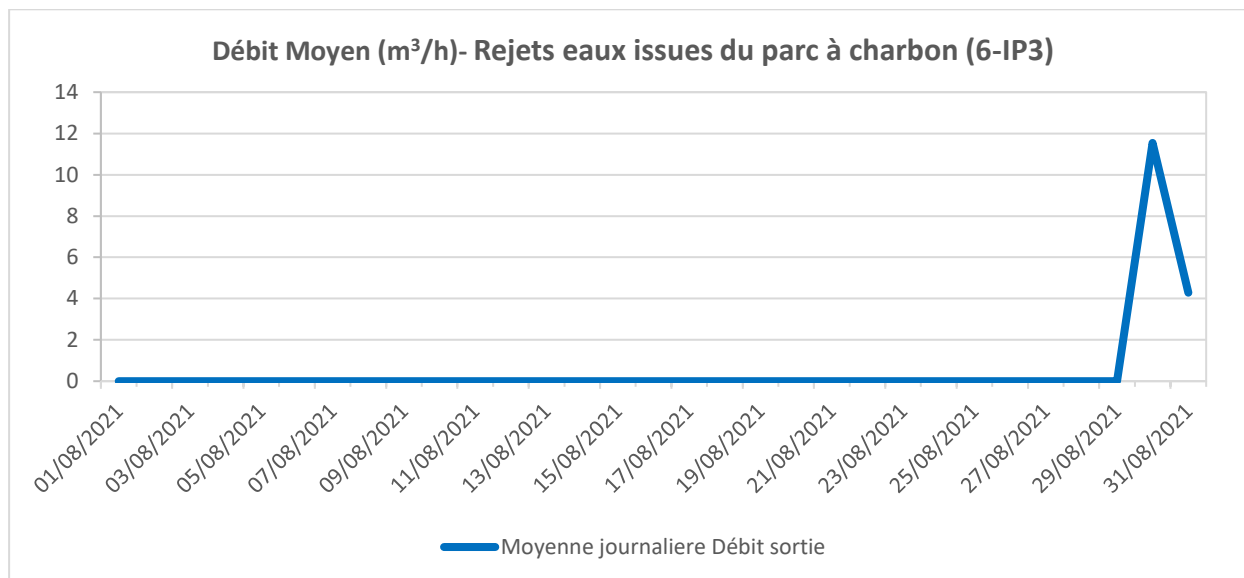

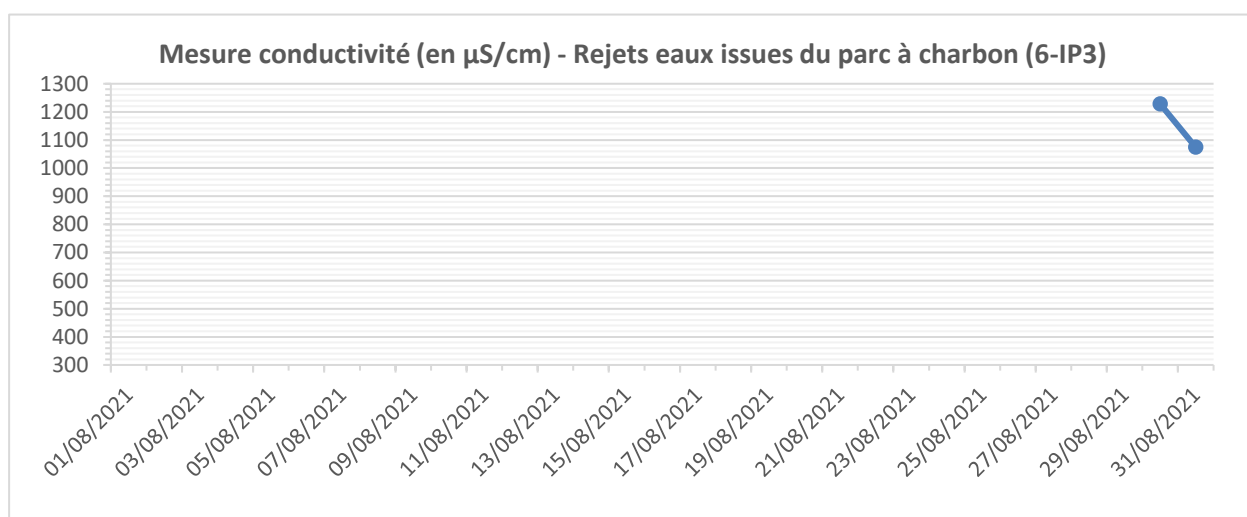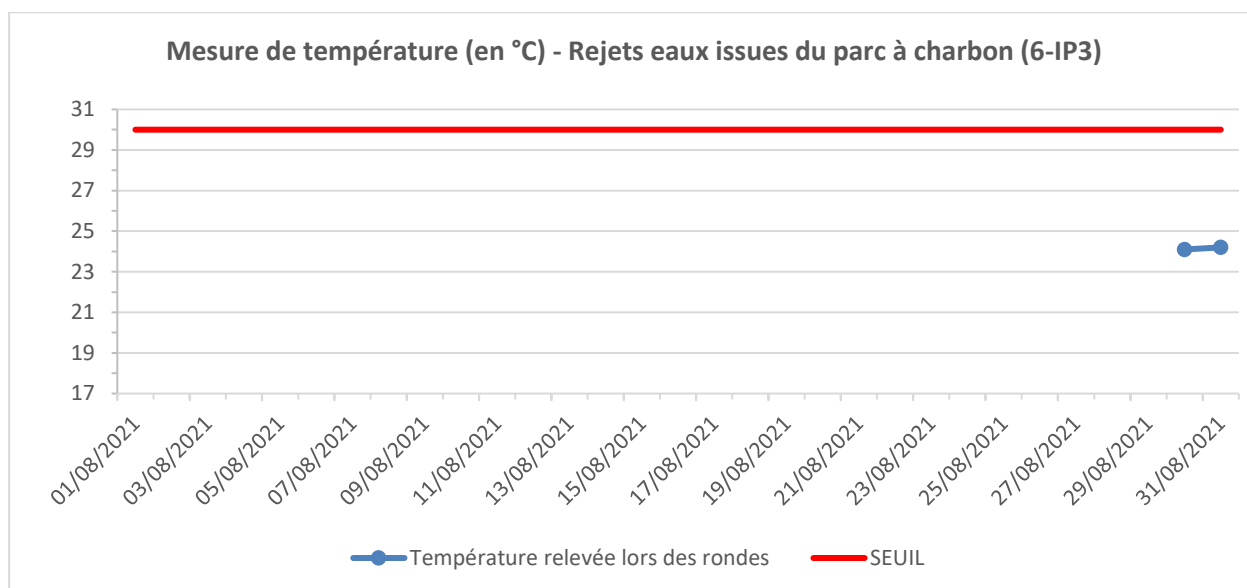

Analyse des résultats :

- Débit : RAS
- Turbidité : RAS
- pH : RAS
- Température : RAS.
- Conductivité : RAS.

2.3.2 Analyse mensuelle

	Unité	Seuil Règl.	Méthode de référence	30/08/2021
Température	°C	< 30°C	-	21,3
pH	pH	6.5 < pH < 8.5	-	6,87
Matières en suspension	mg/l	< 35 mg/l	NFEN872	10,44
Turbidité in situ	NFU	-	TURBIDIME T	13,4
Indice Hydrocarbures (C10-C40)	mg/l	< 10 mg/l	NFISO93772	0,1
Commentaires : RAS				

2.3.3 Ecart et plan d'actions

Plan d'actions CSSW					
Ecart	Description action	Observations	Avancement	Objectif	Echéance
MES > 30mg/L en sortie UCD	Curage des 2 bassins de décantation	Retard suite blocage.	100%	MES < 30mg/L en sortie UCD	31/07/2021 Ok fait

3. Les rejets gazeux

Les dispositions de la norme NF 44-052 (puis norme EN 13284-1) sont prises en compte et respectées pour les mesures et calcul des données ci-dessous.

Les tableaux normalement utilisés quand les données sont disponibles, présentent, pour chacune des 2 tranches, les concentrations journalières moyennes en CO, NOx, SO2 et poussières, données transmises par le logiciel CDAS en service depuis février 2017.

Ces mesures comprennent les phases de ramonage et d'arrêt de tranche (phases de dépassement autorisé de VLE).

Les débits sont également précisés pour chaque tranche, et sont transmis par le logiciel d'archivage Historian. Pour rappel, l'arrêté ICPE contraint à ne pas dépasser $2 \times 201\,971 \text{ Nm}^3/\text{h}$, soit $403\,942 \text{ Nm}^3/\text{h}$, sur le total de la cheminée double (tranche 1 et tranche 2). Le tableau ci-dessous présente les résultats de ces mesures globales journalières. La somme des débits des 2 tranches est globalement au-dessus de la VLE, lorsque les 2 tranches fonctionnent au nominal.

3.1 Débits totaux

Des mesures de débit ont été retrouvées depuis le 23/07/2021, or :

- Pour la tranche 1, les valeurs sont anormalement hautes, supérieures à $259\,000 \text{ Nm}^3/\text{h}$.
- Pour la tranche 2, les valeurs sont soit anormalement basses, inférieures à $110\,000 \text{ Nm}^3/\text{h}$, soit supérieures à $259\,000 \text{ Nm}^3/\text{h}$.

Pour ces raisons, les mesures journalières de débit globales pour ce mois sont indisponibles.

Toutefois, Bureau Veritas a réalisé une mesure de débit sur la tranche 1 ce mois.

Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous (Cf Annexe 1) :

	Tranche 1	Tranche 2	Débit total (Tranche 1+Tranche 2)	VLE
Date prélèvement	11/08/2021	A l'arrêt		
Débit (Nm^3/h)	239 000	–	239 000	403 942

Le débit pour la tranche 1 dépasse VLE, l'unité fonctionnant au nominal. Mais la tranche 2 étant arrêtée, la somme des débits ne dépasse pas le seuil global de $403\,942 \text{ Nm}^3/\text{h}$ fixé pour les 2 tranches.

3.2 Mesures en continue sur la tranche n°1

Données indisponibles.

Mesures effectuées par Bureau Veritas :

	Débit sec (Nm ³ /h)	CO		SO ₂		Nox		Poussières	
		Mesures (mg/Nm ³)	Flux (kg/h)	Mesures (mg/Nm ³)	Flux (kg/h)	Mesures (mg/Nm ³)	Flux (kg/h)	Mesures (mg/Nm ³)	Flux (kg/h)
VLE Date	201 971	200	–	980	–	650	–	30	–
11/08/2021	239000	8,59	2,01	735	172	949	222	20,8	4,86

- Concernant le débit : voir explication au chapitre précédent.
- Concernant les Nox : on note un dépassement de seuil, sans raison particulière. Afin de retrouver des valeurs durablement conformes, le remplacement de l'ensemble des brûleurs par des brûleurs bas NOX RSFC General Electric est planifié en juillet 2021 pour U1 (commande lancée le 31/07/2020).

Concernant les champs :

- Le champ 1 reste limité à 10 mA.
- Le champ 2 est limité à 350 MA.
- Les champ 3 est limité à 250 mA.
- Les champ 4 est limité à 150 mA

Le skid SO₃ est opérationnel.

3.3 Mesures en continue sur la tranche n°2

Données indisponibles.

Concernant les champs :

- Le champ 1 reste limité à 10 mA.
- Le champ 2 est limité à 350 MA.
- Les champ 3 est limité à 250 mA.
- Les champ 4 en opération.

Le skid SO₃ est bouché depuis le redémarrage de la tranche. Investigation en cours.

3.4 Mesures des flux massiques totaux (pour les 2 tranches)

Données indisponibles.

Données issues du rapport de Bureau Veritas résumées ci-dessous (voir Annexe 1) :

	Tranche 1 Flux (kg/h)	Tranche 2 Flux (kg/h)	Valeur flux total (tranches 1 & 2)	VLE Flux (kg/h)
Date prélèvement	11/08/2021	A l'arrêt		
Poussières	4,86	—	4,86	12,1 kg/h
CO	2,01	—	2,01	80,8 kg/h
Oxyde de soufre SO ₂	172	—	172	396 kg/h
NOx	222	—	222	262,6 kg/h

Une seule tranche fonctionne au nominal avec une baisse de charge sur la fin des mesures, on ne note pas de dépassement de seuil pour les flux.

3.5 Analyse annuelle des rejets gazeux des cheminées

	Tranche 1	Tranche 2	Valeur limite concentration par tranche	Valeur flux total (tranches 1 & 2)	VLE flux	Périodicité	Méthode de référence
Date prélèvement	04/11/2020	03/11/2020					
Débit horaire moy	237 000	237 000	-	474 000	403 942 Nm3/h		
Poussières	5,43	17,6	30 mg/Nm ³	5,6	12,1 kg/h	Continu	NF X 44 052 EN 132841
CO	12,9	15,3	200 mg/Nm ³	5,20	80,8 kg/h	Continu	NF X 43- 300 et FD X 20 361 et 363
Oxyde de soufre SO ₂	870	892	980 mg/Nm ³	431	396 kg/h	Continu	XP X 43 310 FD X 20 351 à 355 et 357 ISO 11 632
NOx	865	714	650 mg/Nm ³	388	262,6 kg/h	Continu	NF X 43 300 NF X 43 018
Dioxines et furannes	0,000702	0	0,1 mg/Nm ³	0,00016	40,4 kg/h	Annuelle	NF EN 948
HAP	0	0	0,1 mg/Nm ³	0,000	40 kg/h	Annuelle	NF X 43 329
COV hors méthane	0,664	0,853	110 mg/Nm ³	0,367	44,4 kg/h	Annuelle	XP X 43 329 NF X 43 301 EN 13526 EN 12619
Cadmium (cd), mercure (Hg) et thallium (Tl)	0,00168	0,00197	0.05 mg/Nm ³ par métal et 0.1 mg/Nm ³ pour (Cd + Hg +Tl)	0,89	20 g/h ou 40 g/h pour (Cd + Hg + Tl)	Annuelle	NF X 43- 051 EN 13 211 NF X 43 308 EN 1231111
Arsenic (As), sélénium (Se), tellure (Te)	0,00571	0,0031	1 mg/Nm ³ pour As + Se +Te	2,2	400 g/h	Annuelle	NF X 43- 051 EN 13 211
Plomb	0,00118	0,00552	1 mg/Nm ³	1,6	400 g/h	Annuelle	NF X 43- 051 EN 13 211

	Tranche 1	Tranche 2	Valeur limite concentration par tranche	Valeur flux total (tranches 1 & 2)	VLE flux	Périodicité	Méthode de référence
Métaux et composés de métaux (Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn + Ni + V + Zn)	0,245	0,431	10 mg/Nm ³	164,9	4 kg/h	Annuelle	NF X 43- 051 EN 13 211

Ces résultats proviennent du rapport de conformité des émissions atmosphériques, n°113684384.4.R, réalisé par Bureau Veritas, lors de leur intervention sur site du 03/11/2020 au 04/11/2020.

Lors des mesures :

- la tranche 1 était en fonctionnement nominal, P=53 MW. Suite à un incident sur un broyeur à charbon, le combustible utilisé jusqu'à environ 10h a été un mixte fuel/charbon. A partir de 10h, passage à 100% charbon.
- La tranche 2 était également en fonctionnement nominal, P=53MW. Aucun évènement particulier n'est à signaler. Pendant toute la durée des essais, les conditions de marche de l'installation ont été normales et stables.

On relève 4 non-conformités :

- Non-conformité des débits moyens avec une valeur totale de 474 000 Nm³/h, pour une VLE de 403 942 Nm³/h.
- Non-conformité des flux des NOx, avec des concentrations de 215 et 173 kg/h, respectivement pour la tranche 1 et pour la tranche 2, soit un total de 388 kg/h pour une VLE de 262,6 kg/h.
- Non-conformité des concentrations en NOx, avec des concentrations de 865 mg/Nm³ et 714 mg/Nm³ respectivement pour la tranche 1 et pour la tranche 2, pour une VLE limitée à 650 mg/Nm³.
- Non-conformité des flux des SO₂, avec des concentrations de 216,0 et 215,0 kg/h, respectivement pour la tranche 1 et pour la tranche 2, soit un total de 431,0 kg/h, pour une VLE de 396 kg/h.

3.6 Rejets gazeux : écarts et plan d'actions

3.6.1 Plan d'action : analyseurs de gaz

Pour rappel, depuis Novembre 2020, nous n'avons plus d'appareil de mesure opérationnel sur les tranches.

Voici la mise à jour des 2 plans d'action, à court terme et à moyen-long terme :

ACTIONS		DELAIS
PLAN D'ACTION A COURT TERME		
1	Suite au câblage du Mamos de location avec multiplexeur : défaillance de pièces ne nous permettant pas de réaliser les analyse d'O ₂ , rendant indisponibles les valeurs corrigées. Commande de pièces pour l'analyseur O ₂ . Remise en service du MAMOS	Ok pièces reçues Ok fait
2	Exploitation des données du Mamos non concluante. Après traitement des données : - Les temps de mesure sont insuffisants (1 à 2h par jour) - Pas de mesure de SO ₂ . Point en cours avec notre prestataire.	Septembre 2021
3	Lasercems envoyé en Europe pour maintenance	Ok fait
4	Retour du Lasercems opérationnel sur site. Lors d'investigation, nous avons trouvé beaucoup de pollution dans les lignes d'échantillonnage chauffées. Besoin d'installer de nouvelles lignes d'échantillonnage chauffées. Commande lancée le 20/07/21. Réception des lignes chauffées.	Ok reçu Septembre 2021
5	Remise en service de l'ensemble	Octobre 2021
6	Mesures de gaz réalisées sur les 2 tranches par Bureau Veritas, tant que les analyseurs Lasercems ne seront pas opérationnels.	Dès octobre 2020
PLAN D'ACTION A MOYEN/LONG TERME		
7	Mise en place de déflecteurs pour limiter l'encrassement des cannes de prélèvement au niveau des cheminées (recommandation du fournisseur).	Ok fait
8	Changement du local de stockage des équipements de mesures pour mettre en place un local spécialisé pour ces analyseurs et conçu pour les protéger des conditions climatiques tropicales.	Ok fait

9	Mise en place d'un 3 ^{ème} Lasercems, avec un système de multiplexage, afin d'avoir un secours commun aux deux tranches. Attente de mise en service des 2 Lasercems revenus d'Europe, avant commande d'un troisième appareil.	Octobre 2021
---	---	--------------

3.6.2 Plan d'action pour les rejets de poussière

Suite au courrier de la DIMENC du 31/01/18, un nouveau plan d'action a été défini pour revenir à la VLE de 30 mg/Nm³ pour les poussières. Voir ci-dessous.

Plan d'actions pour les rejets poussières				
Installation	Actions	Observations	Avancement TR1	Avancement Tr2
Dépoussiéreur	Fiabilisation du champ 1 unité 2 équipé de nouvelles électrodes. 2021 : remise en place des anciennes électrodes.	Augmentation de la rigidité des alignements des plaques émissives. <u>Nota</u> : le dépoussiéreur de l'unité 2 a quasiment la même efficacité que celui de l'unité 1. Devant la difficulté de mise au point de ce champ, le retour en arrière envisagé a été validé au cours de l'arrêt majeur de 2021.	Non concerné	Travaux faits 08/2021
Dépoussiéreur	Fiabilisation du champ 4 Ce champ est à alimentation pulsée.	Cette alimentation est efficace, mais son pilotage n'est pour l'instant réalisé qu'en local. Intégration dans la télé-conduite en salle de quart du champ 4. <u>Nota</u> : ce champ sera maintenu par la technologie actuelle (COROMAX) ou sera basculée en SIR suivant les résultats de ce dernier testé sur l'unité n°1.	Non concerné	Décision 2021
Dépoussiéreur	Essai d'efficacité technologie SIR	Mise en place d'un transformateur type SIR à impulsion (conception concurrente du transformateur COROMAX installé sur le champ de U2) construit par General Electric. Installation initialement prévue en décembre 2020, repoussé 2021 suite COVID-19	10/2021 A confirmer	Non concerné
Dépoussiéreur	Réguler la température d'entrée des gaz chauds entre 130° et 135°C	La courbe de résistivité des cendres est croissante en fonction de la température. Etude sur le ramonage acoustique pour les RA, repoussé suite COVID-19 (expert australien ne pouvant pas venir en NC)	Arrêt majeur 2023	Arrêt majeur 2024 selon rex U1
Injections de soufre	Amélioration du calorifugeage des skids	Doit permettre d'éviter des arrêts sur solidification des skids, et améliorer les phases de démarrage des skids.	100%	100%
Condenseurs	Amélioration du rendement des tours aéro-réfrigérantes	U1 : 2020 : mise en place des viroles plus hautes et nouveaux sprinklers. Repoussé 2021 suite CODIV-19. => 2021 : abandon de la modification de hauteur des viroles	100%	08/2022

Plan d’actions pour les rejets poussières				
Installation	Actions	Observations	Avancement TR1	Avancement Tr2
		U2 : 2021 : mise en place de viroles plus hautes abandonnée + installation de nouveaux sprinklers. Repoussé 2022 suite COVID-19		
Mesures des rejets gazeux	Cohérence des chaines de mesures poussières DURAG	Inspections et optimisation des réglages des analyseurs effectués par Aquagas à chaque arrêt majeur. Pas d’intervention en 2020 suite COVID-19. Pas d’intervention en 2021 car Lacercems HS. Voir plan d’action chapitre 3.6	Arrêt majeur 2022	Arrêt majeur 2022
Mesures des rejets gazeux	Cohérence des chaines de mesures gaz LaserCEM			
Mesures des rejets gazeux	Cohérence des chaines de mesures poussières DURAG	Plan de métrologie en cours de mise en place dans le cadre des certifications ISO 14001 & 9001 de la centrale.	100%	
Mesures des rejets gazeux	Cohérence des chaines de mesures gaz LaserCEM			
Procédure d’exploitation	Perfectionnement des équipes de quart au réglage de la combustion	Mise en place d’une analyse systématique de la granulométrie, du taux de cendres et des vitesses d’injection de charbon pulvérisé dans la chaudière pour améliorer le réglage du point de fonctionnement optimal. Le matériel est en place, la procédure reste à établir.	100%	100%
Combustible	Recherche d’un charbon le moins résistif possible	Le charbon fourni par JERA depuis le 20/02/19 donne de bons résultats. Contrat d’approvisionnement fait sur 3 ans avec JERA.	100%	100%

4. Emissions sonores

4.1 Contexte réglementaire

La campagne de mesure de bruit de 2019 a été réalisée par Bureau Veritas, et s'est déroulée du 28 au 30 décembre. Elle fait suite à celle réalisée sur la zone de projet en 2001, puis aux campagnes de 2005, 2007, 2010, 2013, et 2016.

Les précédentes campagnes ont été réalisées afin de vérifier l'évolution des niveaux sonores aux différents stades d'avancement de l'activité industrielle et minière de Vale.

- 2001 : Etat initial, pas de fonctionnement des installations.
- 2005 : Phase de construction, pas de fonctionnement des installations.
- 2007 : Phase de construction, pas de fonctionnement des installations.
- 2010 : Phase de test et de mise en service des installations.
- 2013 : première année d'exploitation avec une montée en puissance progressive des opérations.

L'arrêté d'autorisation d'exploiter n°1467-2008/PS du 9 décembre 2008 impose que ce suivi soit effectué en fin de première année d'exploitation, puis tous les trois ans.

Par ailleurs, la délibération n°741-2008/BAPS du 19 décembre 2008, relative à la limitation des bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement, fixe pour chacune des périodes (diurne et nocturne), les niveaux de bruits à ne pas dépasser ne limite de propriété de l'établissement, déterminées de manière à assurer le respect des valeurs d'émergence admissibles.

4.2 Procédure de mesures pour la campagne 2019

La méthode de mesurage de type expertise, définie par l'arrêté du 23/01/97 a été retenue.

5 points de mesures ont été retenus dans le voisinage de Vale. Ils correspondent à la localisation des points de suivis réglementaires de la campagne de 2013.

Description des points de mesures et intervalles de mesurage

Point	Description	Hauteur	Intervalles de mesurage	Remarque
1 - PRONY	Situé sur le parking du warf de la baie de la Somme. A l'Ouest des installations VALE NC.	1.5 m	Le 29/10 de 12h53 à 14h12 et le 29/10 à 23h36 au 30/10 à 00h27	-
2 - CASY	Au Sud-Ouest des installations VALE NC.	1.5 m	Le 30/10 de 18h53 à 20h52 et le 30/10 de 21h01 à 21h36	-
3 - PORT BOISE	Au Sud-Est des installations VALE NC.	1.5 m	Le 28/10 de 11h10 à 12h10 et le 29/10 de 22h09 à 22h42	-
4 - TRIBU DE GORO	A l'Est des installations VALE NC.	1.5 m	Le 28/10 de 9h25 à 10h25 et le 29/10 de 21h01 à 21h46	-
5 - BASE VIE	A l'Ouest des installations VALE NC.	1.5 m	Du 28/10 à 13h12 au 29/10 à 12h13	-

Position des points de mesures



D'après les études des anciens rapports (2007, 2010, 2013 et 2016), l'activité de Vale n'a aucun impact sur les mesures effectuées sur les points 1, 2, 3, et 4. L'activité industrielle est inaudible sur ces points. Pour ces 4 points, il a donc été décidé de couvrir une période de 30 minutes à 1h en période de jour et en période de nuit.

Concernant le point n°5 – Base vie, impacté par les émissions sonores du site, la durée de la mesure a été voisine de 20h, afin de couvrir une durée minimale de 6h en période de jour et de 6h également en période de nuit.

4.3 Résultats de la campagne de mesures 2019

Résultats campagne 2019, Bureau Veritas

Point de mesure	Zone à émergence réglementée	Période	Indicateur utilisé	Bruit ambiant dB (A)	Bruit résiduel dB (A)	Emergence calculée dB (A)	Emergence autorisée dB (A)	Avis
1 - PRONY	Situé sur le parking du warf de la baie de la Somme. A l'Ouest des installations VALE NC.	Diurne	LAeq	46.5	46.5	0	5	Conforme
		Nocturne	LAeq	43	43	0	4	Conforme
2 - CASY	Au Sud-Ouest des installations VALE NC.	Diurne	LAeq	43.5	43.5	0	6	Conforme
		Nocturne	LAeq	44	44	0	4	Conforme
3 - PORT BOISE	Au Sud-Est des installations VALE NC.	Diurne	LAeq	43	43	0	6	Conforme
		Nocturne	LAeq	37	37	0	4	Conforme
4 - TRIBU DE GORO	A l'Est des installations VALE NC.	Diurne	L50	36	36	0	6	Conforme
		Nocturne	LAeq	42	42	0	4	Conforme
5 - BASE VIE	A l'Ouest des installations VALE NC.	Diurne	LAeq	41.5	41.5	0	6	Conforme
		Nocturne	LAeq	40	31	9	4	Non conforme

La mesure réalisée à la base vie est la plus poche du site industriel et minier de Vale, et le seul au niveau duquel une influence industrielle est audible.

La mesure diurne ne fait pas apparaître d'émergence par rapport aux mesures de 2007. En revanche, la mesure nocturne, comme en 2016, fait apparaître une émergence supérieure à la valeur réglementaire de 4 dB(A).

Comme noté lors de la campagne de 2016, selon le Plan d'Urbanisme Directeur de la ville du Mont-Dore, ce point est situé dans une Zone naturelle d'exploitation et de valorisation des ressources minières (Nmin). Or, cette zone est exclusivement réservée à l'activité minière et à toutes ses activités annexes. Cette zone ne peut donc pas être considérée comme une zone à Emergence Réglementée. Les personnes y résidant travaillent sur le site et ne peuvent pas être considérées comme des tiers. Le calcul de l'émergence réalisée est donc fait à titre indicatif.

Cette mesure peut s'apparenter tout au plus à point de contrôle en limite de propriété de Vale. Dans ce cas, les différentes mesures sont inférieures aux limites réglementaires en limite de propriétés :

- 70 dB(A) en journée (6h-21h) ;
- 60 dB(A) de nuit (21h-6h).

Les zones à émergences réglementées sont trop éloignées des sites de Vale pour que leur environnement sonore soit influencé de manière notable par leur activité.

5. Les déchets

5.1 Suivi mensuel de déchets

Dans le cadre de la protection de l'environnement, un suivi mensuel est établi sur les déchets listés ci-dessous :

Désignation du déchet	Code (décret 2002- 540)	Code (conv Bale)	Quantité (tonnes)		Origine du déchet	Transporteur	Eliminateur	
							Dénomination	Mode de traitement
Cendres	10 01 02	GG040	2 257,64	2 257,64	Combustion charbon	SARL CENDRIER Tribu de Waho BP102 98824 Yaté	CSP Gadgi	Enfouissement
				0		SARL CENDRIER jusqu'au port Vale, puis transport maritime	Veolia, Australie	
Mâchefers	10 01 01 10 01 14	GG030	416,10		Combustion charbon	SARL CENDRIER Tribu de Waho BP102 98824 Yaté	CSP Gadgi	Enfouissement
Huiles usagées	13 02 05 13 01 10	Y8	5 000 1		Atelier mécanique	ADVIDANGE	SLN	Incinération avec récupération d'énergie
Déchets souillés hydrocarbures	15 02 02	Y8	0,597		Atelier mécanique	Komwaï	SOCADIS	Export
Filtres à huile usagés	16 01 07							
Bombes aérosols	18 02 05	-	0,082		Atelier mécanique	Komwaï	SOCADIS	Export
Résidus bombes aérosols	16 05 06		0,032					
Pneumatiques usagés	16 01 03	B3140	-		Atelier mécanique	Prony Energies	La Décembreso n du pneu	Export
Batteries usagées	16 06 01	A1170	-		Atelier mécanique	SFAC	SFAC	PVC export
DIB, Emballages plastiques, cartons, bois,	20 01 01 20 01 02 20 01 08 20 01 39 20 03 01 15 01 01 15 01 02 15 01 03	-	7,38		Toutes activités	EMC	EMC	Mise en décharge
Ferrailles	17 04 05 17 04 07	-	3,16		Atelier mécanique	EMC	EMC	Mise en décharge

* Aucun autre déchet évacué ce mois.

Désignation du déchet	Code (décret 2002-540)	Code (conv Bale)	Quantité (Unités)	Origine du déchet	Transporteur	Eliminateur	
						Dénomination	Mode de traitement
-	-	-	-	-	-	-	-

5.2 Déchets : Ecarts et plan d'actions

Plan d'actions déchets					
Ecart	Description action	Observations	Avancement	Objectif	Echéance
Pas de procédure écrite pour la gestion du stockage d'huile neuve	Mise à jour de la procédure huile pour intégrer l'huile neuve. Amélioration de l'analyse des risques correspondante à réaliser.	L'accès au local huiles neuves est sécurisé : porte fermée à clé, grilles installées (voir photo ci-dessous)	90%	Optimiser la gestion des huiles neuves.	12/2021



Photo entrée du local de stockage huiles neuves.

6. Surveillance des légionnelles

6.1 Résultats des analyses mensuelles

	Date prélèvement	UFC/litre		Seuil	Périodicité
		TR01	TR02	1000	Mensuelle
Août 2020	04/08/2020	<100	5 000	TR02 -Non conforme	
	<i>Commentaire</i> : TR2 – Présence de 5 000 Legionella pneumophila sérotype 2-14. A la suite du dépassement du nombre de germes sur TR2, montée du chlore à 3mg/L sur 24H, puis injection biocide 120 Litres.				
	18/08/2020	<100	400	Conforme	
Septembre 2020	08/09/2020	900	A l'arrêt	Conforme	
	22/09/2020	5 000	200	TR01 -Non conforme	
	<i>Commentaire</i> : TR1 – Présence de 5 000 Legionella pneumophila sérotype 2-14. A la suite du dépassement du nombre de germes sur TR1, montée du chlore à 3mg/L sur 24H, puis injection biocide 120 Litres.				
Octobre 2020	08/10/20	<100	100	Conforme	
	28/10/20	2 900	<100	TR01 -Non conforme	
	<i>Commentaire</i> : TR1 – Présence de 2 900 Legionella pneumophila sérotype 2-14. A la suite du dépassement du nombre de germes sur TR2, montée du chlore à 3mg/L sur 24H, puis injection biocide 120 Litres				
Novembre 2020	12/11/20	–	–	–	
	<i>Commentaire</i> : Prélèvement prévu le 12/11/20 annulé en raison du blocage routier du site pour raison social.				
Décembre 2020	02/12/2020	10 000	9 000	TR01 & TR02 - Non conformes	
	<i>Commentaire</i> : TR1 & TR2 – Présence de 10 000 et 9000 UFC Legionella pneumophila sérotype 2-14. A la suite du dépassement du nombre de germes sur TR1 & TR2, montée du chlore à 3mg/L sur 24H, puis injection biocide 120 Litres				
	20/12/2021	<100	<100	Conforme	
Janvier 2021	06/01/21	14 000	700	TR01 -Non conforme	
	<i>Commentaire</i> : TR1– Présence de 14 000 UFC/L Legionella pneumophila sérotype 2-14. A la suite du dépassement du nombre de germes sur TR1, montée du chlore à 3mg/L sur 24H, puis injection biocide 120 Litres				
		–	–	–	
	<i>Commentaire</i> : deuxième prélèvement non réalisé en raison du blocage routier du site pour raison social.				
Février 2021	04/02/2021	5000	200	TR01 -Non conforme	
	<i>Commentaire</i> : TR1 – Présence de 5 000UFC/L Legionella pneumophila sérotype 2-14. A la suite du dépassement du nombre de germes sur TR1, montée du chlore à 3mg/L sur 24H, puis injection biocide 120 Litres				
	22/02/2021	<100	300	Conforme	
Mars 2021	22/03/2021	<100	<100	Conforme	
		–	–	–	
	<i>Commentaire</i> : deuxième prélèvement non réalisé en raison du blocage routier du site pour raison social.				
Avril 2021	06/04/2021	600	<100	Conforme	
	21/04/2021	600	<100	Conforme	

	Date prélèvement	UFC/litre		Seuil	Périodicité
		TR01	TR02	1000	Mensuelle
Mai 2021	04/05/2021	1 600	700	TR01 -Non conforme	
	<i>Commentaire :</i> TR1 - Présence de 1 600 Legionella pneumophila sérotype 2-14. A la suite du dépassement du nombre de germes sur TR1 et présence élevée sur la TR2, montée sur les deux tranches du chlore à 3mg/L sur 24H, puis injection biocide 120 Litres				
	18/05/2021	400	<100	Conforme	
Juin 2021	01/06/2021	500	< 100	Conforme	
	15/06/2021	< 100	200	Conforme	
	29/06/2021	600	400	Conforme	
Juillet 2021	13/07/2021	< 100	A l'arrêt	Conforme	
	27/07/2021	1 600	A l'arrêt	TR01 -Non conforme	
	<i>Commentaire :</i> TR1 - Présence de 1 600 Legionella pneumophila sérotype 2-14. A la suite du dépassement du nombre de germes sur TR1, montée du chlore à 3mg/L sur 24H, puis injection biocide 120 Litres				
Août 2021	10/08/2021	400	< 100	Conforme	
	24/08/2021	A l'arrêt	< 100	Conforme	

6.2 Légionnelles : écarts et plan d'actions

Plan d'actions légionnelles					
Ecart	Description action	Observations	Avancement	Objectif	Echéance
Concentration en Legionella > 1000 UFC par litre dans les bassins	Commande de 2 chlorimètres en ligne	Permettra l'injection de chlore en continu. Installation effectuée sur U1 en janvier 2020. Installation prévue sur U2 d'ici juin 2020.	100%	Concentration en Legionella < 1000 UFC par litre dans les bassins	01/06/20

Suivi plan d'actions extrait de l'AMR 2019

Niveau de priorité	Actions extraites de l'AMR révision 2019	Observations	Délai
P2	1. Intégrer au plan de surveillance des rondiers une action de purge sur by-pass SEI.HV.1477.	En attente du changement de la vanne d'isolement	Ok fait
P2	2. Définir une procédure de désinfection en cas d'arrêt des unités de filtration.	Procédure orange à mettre à jour afin de s'assurer du fonctionnement des 2 centrifugeuses.	Ok fait
P2	3. Mise en place d'un chlorimètre en ligne pour augmenter la rapidité de réaction en cas de contamination des tours, avec remontée d'alarme.	Chlorimètre mis en place sur U1 en janvier 2020. Chlorimètre mis en place sur U2 en décembre 2020. Remontée d'alarme à faire.	Mars 2022
P2	4. Détecter les défauts d'injection du traitement biocide par la mise en place d'un chlorimètre en ligne avec remontée des alarmes en salle de contrôle.	Chlorimètre mis en place sur U1 en janvier 2020. Chlorimètre mis en place sur U2 en décembre 2020. Remontée d'alarme à faire.	Mars 2022
P2	5. Définir un moyen de suivre l'épaisseur de mousse ou le fonctionnement de la pompe pour détecter un défaut d'injection du traitement bio dispersant.	Contrôle visuel uniquement.	Ok fait
P2	6. Définir un planning prévisionnel du poste de responsable chimie pour parer à toute interprétation tronquée des résultats de suivi analytique légionnelle.	Planning défini.	Ok fait
P2	7. Accentuer la formation du personnel amené à interpréter les résultats de suivi analytique du risque légionnelle.	Commande d'un ATPmètre en cours. Consigne d'utilisation rédigée.	Ok fait
P2	8. Définir des fiches réflexes pour accompagner le personnel à réagir efficacement en cas de survenue de situation dégradée.		Mars 2022
P2	9. Définir un plan d'action vis-à-vis de la TAR de VALE à proximité.	Echange d'email avec Vale dès qu'un dysfonctionnement de leurs TAR est observé.	Ok fait
P3	10. Définir un moyen de remontée des observations avec photos de pollution par la TAR de VALE à proximité.	Echange d'email avec Vale dès qu'un dysfonctionnement de leurs TAR est observé.	Ok fait
P3	11. Augmenter la fréquence de surveillance de développement d'algue et biofilm de l'intégralité de la zone tropicale située au-dessus des dévésiculeurs.	Inspection systématique réalisée lors des arrêts majeurs programmés et lors des arrêts sur opportunité.	Ok fait
P3	12. Suivre la fréquence de vérification de l'état des dévésiculeurs (intégrer au plan de surveillance des rondiers).	Vérification intégrée au plan de surveillance maintenance lors des arrêts.	Ok fait
P3	13. Remplacer l'ATPmètre indisponible par un nouvel appareil.	Commande d'un ATPmètre en cours. Consigne d'utilisation rédigée.	Ok fait
P4	14. Mettre en place un scellé sur la vanne by-pass de la CRF.HV.1458 pour s'assurer de son maintien en position ouverte.		Ok fait

P4	15. Prévoir un nettoyage systématique des plaques à orifices dans les collecteurs A/R des circuits SRA (à ajouter au plan d'entretien).	Vérifier si ce nettoyage est bien réalisé.	Ok fait
P4	16. Intégrer au plan de métrologie les appareils de mesures 3D TRASAR.	Métrologie actuellement assurée par Mésachimie. S'assurer de la réception des rapports de calibrage/étalonnage.	Ok fait
P4	17. Intégrer des dates prévisionnelles dans le fichier du cahier de suivi et y associer des rappels pour les mesures réglementaires.		Ok fait
P4	18. Prévoir une surveillance du stock de produits chimiques lors de la mise en place du nouveau contrat de fourniture des produits.		Ok fait

Annexe - 1. Rapport Bureau Veritas – Mesures des émissions atmosphériques – Août 2021



Bureau Veritas Exploitation SAS
NOUMEA
Centre d'Affaires « La Belle Vie »
BP 30514
98895 NOUMEA Cedex NOUVELLE CALEDONIE
Téléphone : 00 687 41 02 60
Mail : bertrand.simon@bureauveritas.com

PRONY ENERGIES
BP C2
98848 NOUMEA

Mesures des émissions atmosphériques

AOÛT 2021



Intervention du 11/08/2021 au 20/08/2021

Nom du site : PRONY RESOURCES NC
Latitude : -90.4931
Longitude : 38.5752

Lieu d'intervention : PRONY ENERGIES
SITE PRONY RESOURCES
98809 MONT DORE

Numéro d'affaire : 11713287/2/1
Référence du rapport : 113684444.2.R
Rédigé le : 10/09/2021
Par :

Ce document a été validé par son auteur.
Ce rapport contient 36 pages.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation.



ACCREDITATION
N° 1-6257
PORTEE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

SOMMAIRE

1 . CONCLUSION DES ESSAIS:	3
2 . SYNTHÈSE DES RESULTATS:	4
3 . OBJET DE LA MISSION:	6
3.1 . LISTE DES INSTALLATIONS CONTRÔLÉES:	6
4 . DESCRIPTION ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT:	6
4.1 . PRONY ENERGIES - TRANCHE 1:	6
4.1.1 . ACCOMPAGNEMENTS :	6
4.1.2 . DESCRIPTION :	6
4.1.3 . CONDITIONS DE MARCHÉ DURANT LES ESSAIS :	6
4.1.4 . ÉVÉNEMENTS PARTICULIERS DURANT LES ESSAIS :	6
5 . ÉCARTS AUX DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE:	8
5.1 . PRONY ENERGIES - TRANCHE 1 - TRANCHE 1:	8
6 . ANNEXE : MÉTHODOLOGIE ET CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE	10
7 . ANNEXE : PRONY ENERGIES - TRANCHE 1	13
7.1 . DESCRIPTION DES CONDITIONS DE RÉALISATION DE MESURE :	13
7.2 . DESCRIPTION DU POINT DE MESURE:	14
7.3 . DÉBIT :	16
7.4 . TENEUR EN VAPEUR D'EAU:	19
7.5 . PRÉLEVEMENTS MANUELS:	20
7.6 . ANALYSE DE GAZ EN CONTINU:	25
7.7 . REPRÉSENTATION GRAPHIQUE DES ANALYSES DE GAZ EN CONTINU :	29
8 . ANNEXE : RAPPORT D'ANALYSES LABORATOIRE :	30

SUIVI DU DOCUMENT

Révision	Commentaires
0	Première émission du document

1 . CONCLUSION DES ESSAIS:

Synthèse des mesures réalisées dans les conditions de fonctionnement décrites au paragraphe **DESCRIPTION ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT**

Liste des conduits	Respect de la VLE* pour l'ensemble des paramètres mesurés	Détail des paramètres ne respectant pas la VLE*
PRONY ENERGIES - TRANCHE 1 / Tranche 1	NON	Concentration : NOx

* : Bureau Veritas compare la moyenne de ses résultats de mesure avec les Valeurs Limites d'Emissions (VLE) les plus contraignantes. En cas de dépassement de celles-ci, Bureau Veritas peut éventuellement effectuer la comparaison avec les autres VLE fournies. Ces VLE se rapportent aux textes de référence en annexe **Méthodologie et contexte réglementaire**. Pour conclure au respect ou non de la VLE, l'incertitude associée au résultat n'est pas prise en compte.

2. SYNTHESE DES RESULTATS:

Si des valeurs limites vous sont applicables et ont été portées à notre connaissance, celles-ci sont indiquées dans le tableau ci-dessous.

Tableau de synthèse de résultats des essais :

Les résultats présentés ci-dessous correspondent à la moyenne des essais lorsque plusieurs essais ont été réalisés. Le détail de chaque essai est présenté en annexe,

Paramètres	Essai	Mesure				Flux				COFRAC
		Valeur	Incertitude absolue	VLE	Unité	Valeur	Incertitude absolue	VLE	Unité	
INSTALLATION : PRONY ENERGIES - TRANCHE 1- Conduit : Tranche 1										
Date(s) de mesure : Entre le 11/08/2021 09:37 et le 11/08/2021 12:52										
Synthèse des résultats de mesure - validité et COFRAC										
Vitesse	Moyenne des essais	16,9	-	-	m/s	-	-	-	-	OUI
Vitesse à l'éjection	Moyenne des essais	16,9	-	> 8	m/s	-	-	-	-	-
Température	Moyenne des essais	143	-	-	°C	-	-	-	-	-
Débit humide	Moyenne des essais	262000	-	-	Nm3/h	-	-	-	-	OUI
Débit sec	Moyenne des essais	239000	-	-	Nm3/h	-	-	-	-	-
Teneur en vapeur d'eau	Moyenne des essais	9,09	-	-	%	-	-	-	-	OUI
O2	Moyenne des essais	6,29	-	-	% sur gaz sec	21400	-	-	kg/h	OUI
CO2	Moyenne des essais	12,9	-	-	% sur gaz sec	60600	-	-	kg/h	OUI
CO	Moyenne des essais	8,59	-	200	mg/Nm3 exprimé en CO sur gaz sec à 6 % O2	2,01	-	-	kg/h	OUI

Paramètres	Essai	Mesure				Flux				COFRAC
		Valeur	Incertitude absolue	VLE	Unité	Valeur	Incertitude absolue	VLE	Unité	
NOx	Moyenne des essais	949	-	650	mg/Nm3 exprimé en NO2 sur gaz sec à 6 % O2	222	-	-	kg/h	OUI
Poussières	Moyenne des essais	20,8	-	30	mg/Nm3 sur gaz sec à 6 % O2	4,86	-	-	kg/h	OUI
SO2	Moyenne des essais	735	-	980	mg/Nm3 exprimé en SO2 sur gaz sec à 6 % O2	172	-	-	kg/h	OUI

Rappel sur les incertitudes :

Les incertitudes affichées correspondent aux incertitudes élargies d'un facteur k=2.

L'incertitude sur le résultat de la moyenne des essais n'est pas calculée.

Dans le cas où les conditions environnementales ou de fonctionnement n'ont pas permis de réaliser les prélèvements selon les règles de l'art, les incertitudes ne sont pas affichées.

Afin de faciliter la lecture, les incertitudes absolues Y sur une valeur X pourront être notées $X \pm Y$.

Cela indique qu'en réalité, la valeur de X est comprise entre X-Y et X+Y.

Note : L'affichage des valeurs est arrondi à 3 chiffres significatifs et arrondi arithmétique selon le 4ème chiffre non conservé.

3 . OBJET DE LA MISSION:

A la demande de BUREAU VERITAS BRANCH NOUMEA, Bureau Veritas a fait intervenir :

- Rudy ANCKAERT
- Bertrand SIMON

La mission suivante a été réalisée : Mesures des émissions atmosphériques.

3.1 . LISTE DES INSTALLATIONS CONTROLEES:

Lors de notre visite nous sommes intervenus sur le périmètre suivant :

- Prony Energies - Tranche 1

La mission de Bureau Veritas s'est limitée aux installations et périodes de fonctionnement citées dans le rapport.

4 . DESCRIPTION ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT:

4.1 . PRONY ENERGIES - TRANCHE 1:

4.1.1 . ACCOMPAGNEMENTS :

Nous n'avons pas été accompagnés lors de notre intervention sur cette installation.

4.1.2 . DESCRIPTION :

Type d'installation : Centrale thermique

Puissance nominale : 55 MW

Date de mise en service : 2008

Combustible : Charbon

Traitement des fumées : Electrofiltre

4.1.3 . CONDITIONS DE MARCHE DURANT LES ESSAIS :

Les vérifications ont été effectuées aux régimes réglés par l'exploitant, responsable de la représentativité de ses conditions de fonctionnement.

Régime de fonctionnement : 53 MW

4.1.4 . EVENEMENTS PARTICULIERS DURANT LES ESSAIS :

Aucun évènement particulier n'est à signaler. Pendant toute la durée des essais, les conditions de marche de

l'installation ont été normales et stables.

5 . ECARTS AUX DOCUMENTS DE REFERENCE:

5.1 . PRONY ENERGIES - TRANCHE 1 - TRANCHE 1:

Aucun écart n'a été relevé.
